

2-1. 평화도로 및 남북측도로망 확충

【토 목 부】

❖ 평화도로 및 남북측도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형 발전 도모

☐ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
영종~신도 평화도로 건설공사	L=3.26km B=13.5m	2019. 4. ~ 2026. 1.	126,383	2021. 1.착공 공사 11.1% 보상 0.0%
송인지하차도 및 연결도로 건설공사	L=950m (지하차도 725m) B=50m	2010. 6. ~ 2025.12.	95,100	2022. 2.착공 공사 0.1% 보상 -
서구 거침도~약암리간 도로개설공사	L=6.47km B=2→4차로	2018. 5. ~ 2024.10.	46,600	2021.10.착공 공사 6.9% 보상 0.0%

☐ 추진실적 및 계획

< 영종~신도 평화도로 건설공사 >

- 2021. 1.: 우선시공분 착공 및 실시설계 착수, 착공식 개최
- 2021. 6.: 주민설명회 개최(2회) 및 실시설계(안) 공람 공고
- 2021. 9.: 도로구역 결정, 우선시공분 준공, 본공사 착공
- 2022. 6.: 도로구역 결정(변경) 및 보상 추진
- 2026. 1.: 공사 준공

< 송인지하차도 및 연결도로 건설공사 >

- 2022. 1.: 실시계획 변경인가
- 2022. 2.: 공사 착공
- 2022. 5.: 송림초교 인근 기존 구조물 철거 및 가설방음벽 설치
- 2025.12.: 도로 개통

< 서구 거침도~약암리간 도로개설공사 >

- 2018. 5.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 2.: 도로구역 결정(변경) 고시(인천시 구간)
- 2021.10.: 공사 착공
- 2022. 5.: 도로구역 결정(변경) 신청(김포시 구간)
- 2022. 6.: 토사반입 및 과재쌓기
- 2024.10.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로2팀장	김형철	5191
	담당자(도로1팀)	김현숙	5202
	담당자(도로1팀)	구현호	5201
	담당자(도로2팀)	정준우	5214

2-2. 검단지역 연결도로 확충

【토 목 부】

❖ 서구 검단지역 내 도로망을 확충하여 지역개발 촉진 및 산업단지 물류 비용절감

☐ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황
검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010. 4. ~ 2022. 8.	70,736	2019. 5. 착공 공사 97.3% 보상 100%
봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2023. 4.	43,571	2019.12. 착공 공사 18.0% 보상 100%
검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2023. 4.	66,711	2020. 4. 착공 공사 34.0% 보상 100%
금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. ~ 2026. 1.	128,373	2022. 1. 착공 공사 0.0% 보상 0.0%

☐ 추진실적 및 계획

< 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 >

- 2019. 5.: 공사 착공
- 2021. 2.: 고속도로 연결공사 착수
- 2021. 8.: 종점부(1.6km) 조기개통
- 2022. 6.: 시점부 포장공사
- 2022. 8.: 공사 준공

< 봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사 >

- 2019.12.: 공사 착공
- 2021.12.: 열수송관 이설공사 착공
- 2022. 6.: 지장물 이설공사
- 2023. 4.: 공사 준공

< 점단산업단지~점단우회도로간 도로확장공사 >

- 2019. 2.: 보상 추진
- 2020. 4.: 공사 착공
- 2022. 6.: 지장물 이설공사
- 2023. 4.: 공사 준공

< 금곡동~대곡동간 도로개설공사 >

- 2020. 6.: 도로구역 결정 고시
- 2022. 1.: 공사 착공
- 2022. 8.: 보상 추진
- 2026. 1.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로2팀장	김형철	5191
	담당자(도로2팀)	이여남	5211
	담당자(도로2팀)	이문덕	5212
	담당자(도로2팀)	양태훈	5329

2-3. 청라지구 및 북항 연결도로 확충

【토 목 부】

❖ 청라지구(IHP)와 북항 배후단지 간 연결도로 확보를 통한 지역 균형 발전 도모

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. 2023. 8.	41,300	2018. 8. 착공 공사 51.0% 보상 100%
청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=625m B=35m	2017.12. 2023. 5.	19,000	2020.10. 착공 공사 33.0% 보상 0.0%

☐ 추진실적 및 계획


< 청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사 >

- 2015. 3.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 8.: 기본 및 실시설계용역 준공
- 2018. 8.: 공사 착공
- 2022. 6.: 강교 제작
- 2023. 8.: 공사 준공

< 청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사 >

- 2020.10.: 공사 착공
- 2021. 4.: 지반조사 완료 및 기초파일 자재 구매 완료 등
- 2022. 5.~9.: 강교 제작 및 설치
- 2023. 5.: 공사 준공

< 위치도 >

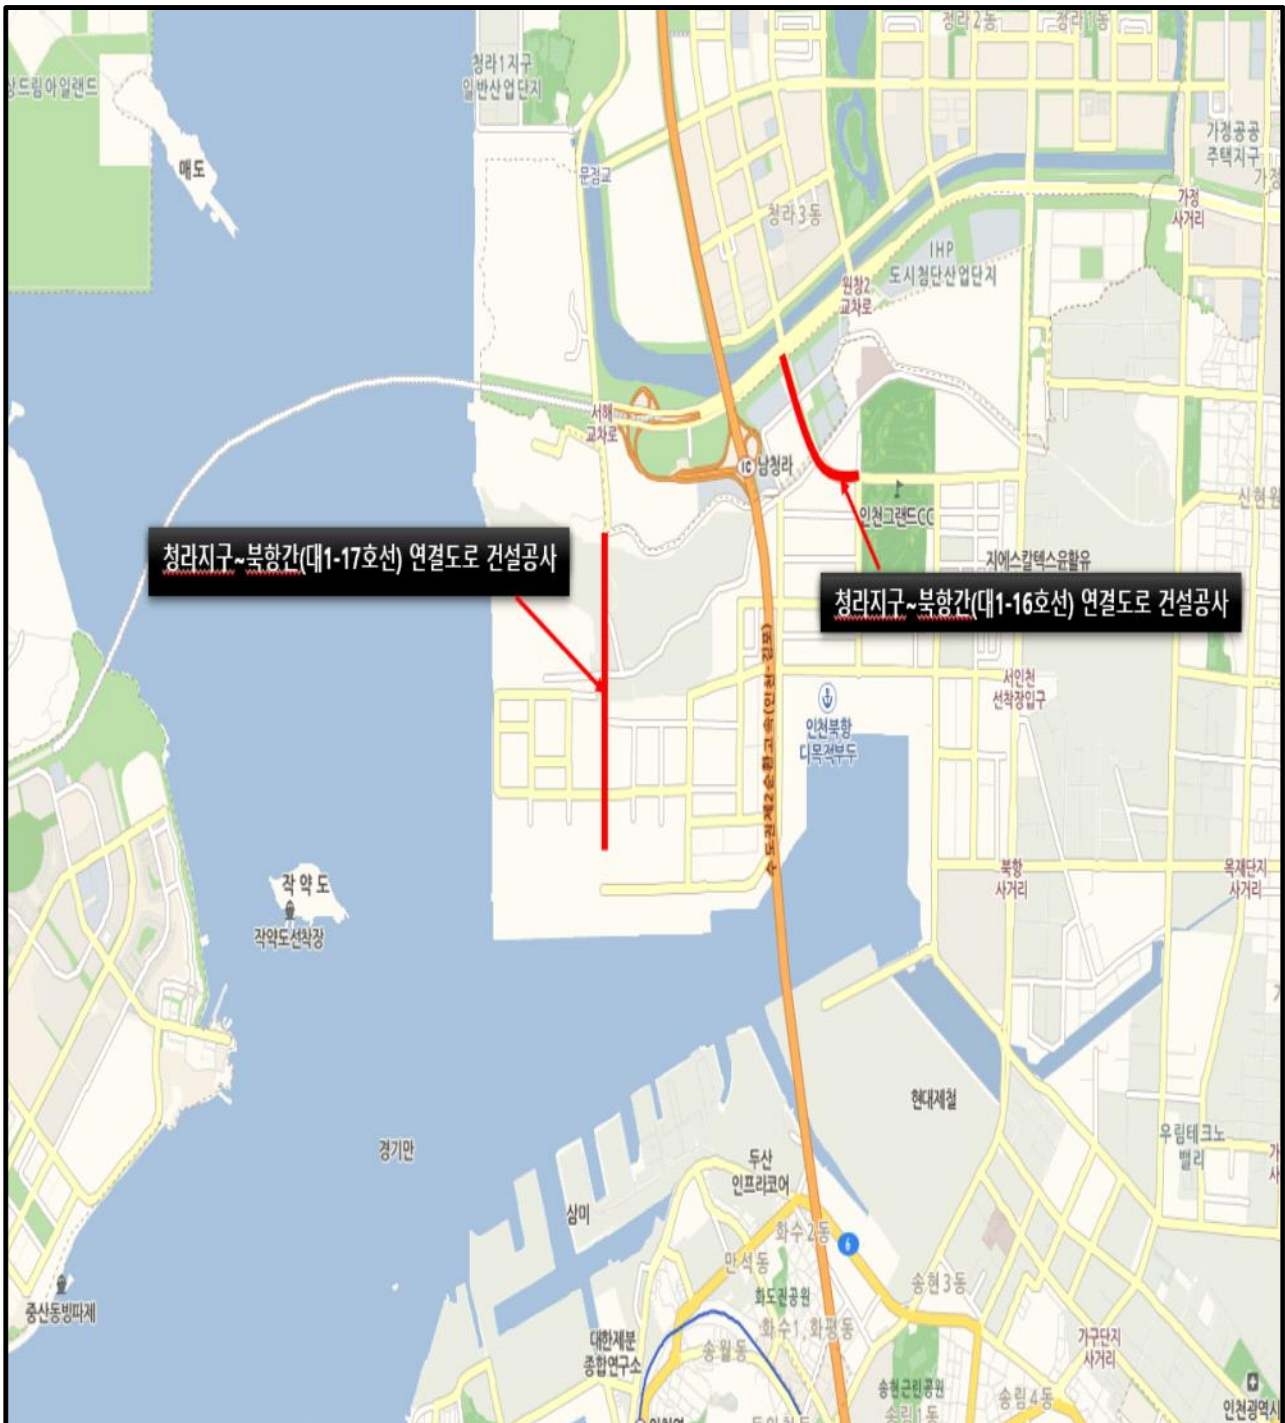

부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자	김시욱	5225
	담당자	변창식	5222

2-4. 주간선도로망 구축 및 도로구조 개선

【토 목 부】

- ❖ 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공 및 안전한 도로환경 조성

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. ~ 2024. 6.	48,933	2021.11.착공 공사 0.1% 보상 0.0%
아암지하차도 건설공사	L=460m B=20m	2019. 7. ~ 2025. 5.	45,879	2022. 6. 착공예정 (설계99.0%)
소암마을~대건고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017.12. ~ 2025. 3.	29,800	2022. 3.착공 공사 1.0% 보상 83.3%

☐ 추진실적 및 계획

< 아암대로~KT송도지사간 도로개설공사 >

- 2017.11.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.12.: 기본 및 실시설계용역 준공
- 2021.11.: 공사 착공
- 2024. 6.: 공사 준공

< 아암지하차도 건설공사 >

- 2019.12.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 6.: 실시계획인가 고시
- 2022. 6.: 공사 착공
- 2025. 5.: 공사 준공

< 소암마을~대건고교간 도로개설공사 >

- 2020.10.: 도로구역 결정(변경) 고시
- 2022. 1.: 보상 추진
- 2022. 3.: 공사 착공
- 2025. 3.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자(도로1팀)	오승일	5205
	담당자(도로3팀)	정기수	5227

2-5. 원도심 도로구조 개선

【토 목 부】

- ❖ 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공 및 안전한 도로환경 조성

☐ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
인천 숲길 조성사업 (1공구, 우선시공)	L=1.8km B=50m	2021.11. ~ 2024.12.	52,390	2022. 1. 착공 공사 0.1% 보상 0.0%
우회고가 정비사업	L=1.69km B=26.3~30.5m	2017. 8. ~ 2023. 5.	49,109	2022. 1. 착공 공사 3.0% 보상 0.0%
건설기술교육원 앞 도로확장공사	L=515m B=30m	2019. 1. ~ 2022.10.	11,700	2020.12. 착공 공사 8.5% 보상 100%

☐ 추진실적 및 계획

< 인천 숲길 조성사업(1공구, 우선시공) >

- 2022. 1.: 공사 착공
- 2022. 4.: 공사 추진방향 협의(고속도로재생과)
- 2022. 5.: 공사 정지(재설계 및 교통소통대책 등 행정절차 이행 완료시 까지)
- 2022. 하반기: 교통소통대책 재수립 등 추진상황을 고려한 실착공 준비


< 우회고가 정비사업 >

- 2020.12.: 하부도로 개설공사 착공
- 2022. 1.: 하부도로 개설공사 준공 및 본공사 착공
- 2022. 5.: 진입 램프 철거
- 2022. 7.: 진출 램프 철거
- 2022. 8.: 본선 교량 철거
- 2023. 5.: 본공사 준공

< 건설기술교육원 앞 도로확장공사 >

- 2020.12.: 공사 착공
- 2022. 3.: 보상 완료
- 2022. 6.: 옹벽 설치
- 2022.10.: 공사 준공

< 위치도 >

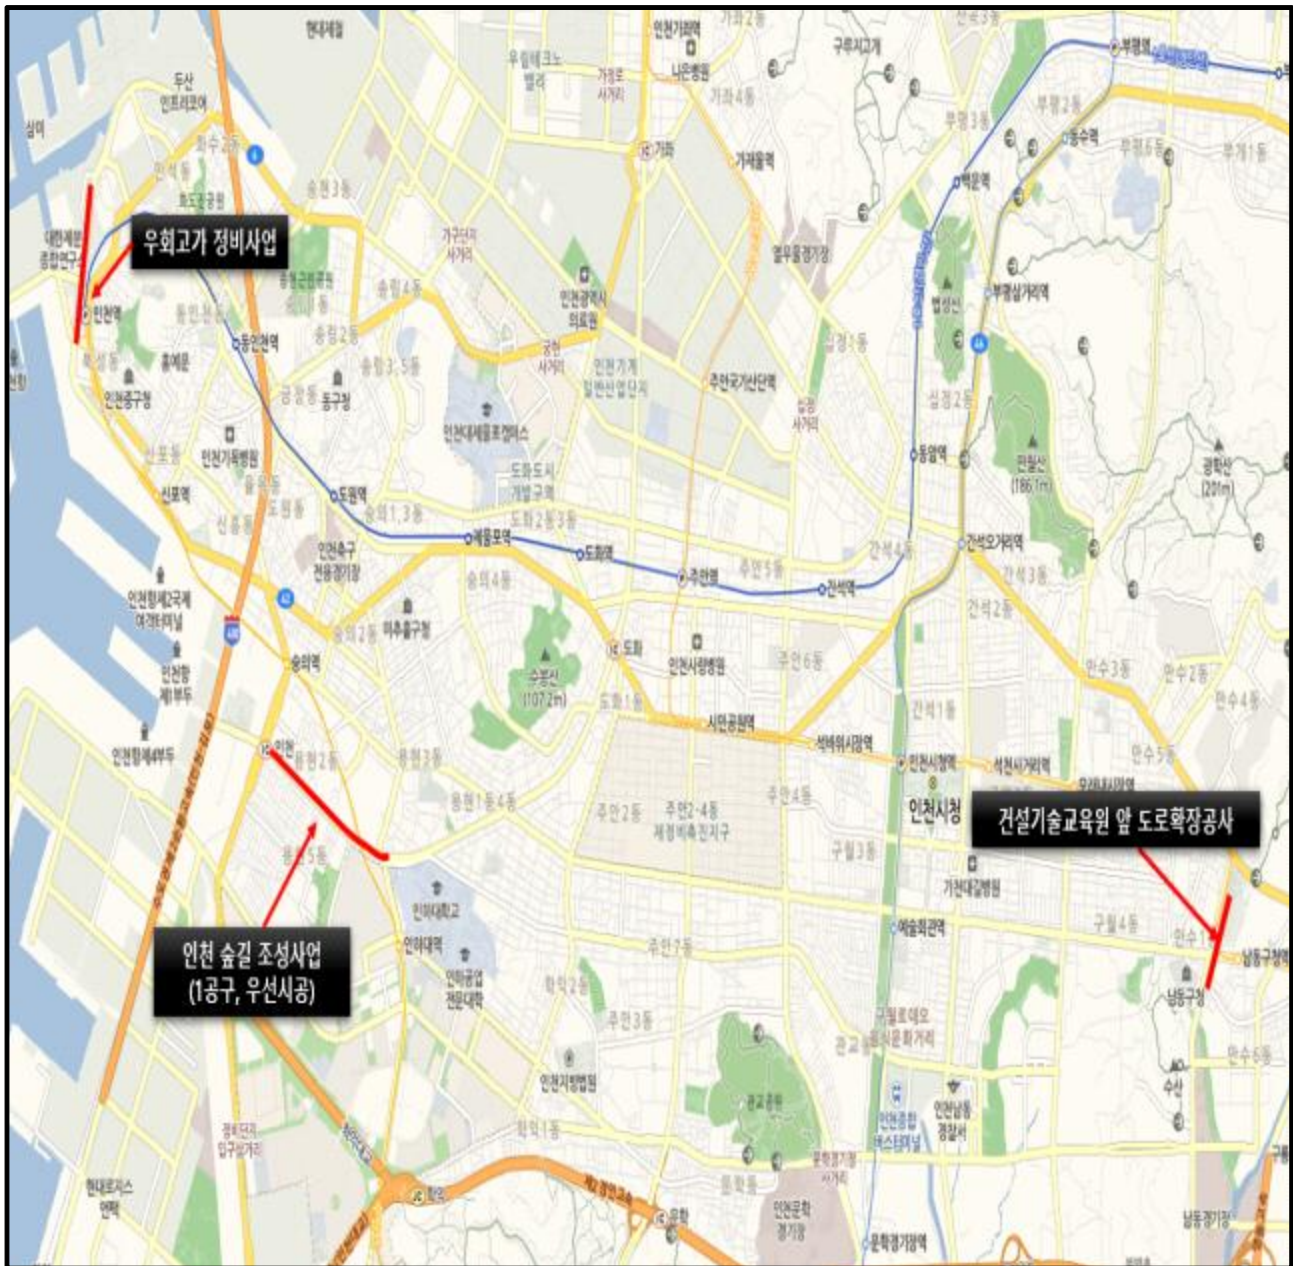

부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자(도로1팀)	김현숙	5202
	담당자(도로3팀)	변창식	5222
	담당자(도로3팀)	이민수	5206

3. 하수 · 하천 건설

3-1. 수해상습지 개선사업	29
-----------------------	----

3-1. 수해상습지 개선사업

【토 목 부】

- ❖ 하천 미개수에 따른 통수단면 부족 부분에 대한 개선사업으로 인근 농경지 침수방지 및 시민 재산권 보호

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.2km (B=10~40m→35~40m)	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	2019.12.착공 공사 37.3% 보상 100%
동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.9km (B=20~50m→35~50m)	2014. 8. ~ 2024. 1.	26,706	2020. 1.착공 공사 47.4% 보상 100%
운연천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.69km (B=4~30m→7~38m)	2017. 8. ~ 2022.11.	18,744	2020.11.착공 공사 50.2% 보상 98.1%

☐ 추진실적 및 계획

< 교산천 수해상습지 개선사업 >

- 2019.12.: 공사 착공
- 2020. 5. ~ 2021.12.: 제방성토 및 연약지반 처리(계측)
- 2021.11. ~ 2022.12.: 호안 및 배수구조물 시공
- 2022. 1. ~ 2023.10.: 부체도로 및 독마루 포장, 교량 시공
- 2023.11.: 공사 준공

< 동락천 수해상습지 개선사업 >

- 2020. 1.: 공사 착공
- 2020. 3. ~ 2021.12.: 제방성토 및 연약지반 처리(계측)
- 2021. 8. ~ 2022.12.: 호안 및 배수구조물 시공
- 2022. 1. ~ 2023. 6.: 갑곶 배수갑문 증설공사 및 교량 시공
- 2023. 6. ~ 12.: 부체도로(14개소) 및 독마루 포장 시공
- 2024. 1.: 공사 준공

< 운연천 수해상습지 개선사업 >

- 2020.11.: 공사 착공
- 2021. 3.: 보상 추진
- 2022. 6.: 교량 구조물 시공 완료,
지장물(가스관 660mm) 이설 완료(한국가스공사)
- 2022.10.: 제방축제, 호안 등 구조물 및 독마루 포장 시공
- 2022.11.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	류노열	5124
	담당자	이길형	5232
	담당자	조형철	5231

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	류노열	5124
	담당자	이길형	5232
