



2013 主要業務計劃



아시아競技大會支援本部

《 보고 순서 》

I. 2012년 추진성과	2
II. 2013년 정책여건 및 목표	4
III. 2013년 주요업무계획	5
 《 대회지원과 》		
1. 국비확보와 소요재원의 효율적 관리	7
2. 2014 인천장애인아시아경기대회 준비철저	9
3. 「비전 2014 프로그램」 추진	11
4. 「남북화해 스포츠 프로그램」 활성화	13
5. 2014 인천AG 대회시설 건설부지 보상	14
 《 시설계획과 》		
1. 2014 인천AG 사업계획(변경 2차) 승인신청	16
2. 그린벨트(GB) 훼손지 복구사업 변경 추진	18
3. 경기장내 체육공원 예정지 활용계획수립	19
4. 민간경기장 및 인접도시 대회시설 활용	20
5. 실외 경기장 건설	22
6. 방송보도시설(MMC) 설치	23
7. 경기장 진입로 확충 및 교차로 개선사업	24
 《 주경기장조성과 》		
1. 서구 주경기장 건설사업	26
2. 강화 경기장 건설사업	29
3. 선수촌 및 미디어촌 건립사업	31
4. AG 기존 경기장 개·보수 사업 추진	32
5. AG 경기장 준공이후 훈련시설(43개소) 개·보수	·	33
 《 경기장건설과 》		
1. 2014 AG 종목별 경기장 건설사업 추진	36
2. 2014 AG 경기장별 미술작품 제작·설치	42

I. 2012년 추진성과

- ◇ 2012년은 “차질 없는 대회준비 실천의 해”로써, 주경기장 포함 9개 경기장에 대해 당초 공정계획에 따라 정상적으로 공사 추진
- ◇ 재정 어려움 극복을 위한 재정운영 기본방향인 “아껴쓰고, 빌려오고, 벌어들이는 재정운영” 실현을 위하여 국비 추가확보 및 불필요한 사업 최소화를 통한 예산절감

▶ 주요 경기장별 공정률 현황

구 분	주경기장	문학	송림	십정	선학	계양	남동	강화	옥련
현 재 (12.12.10)	40.86%	72.23%	55.42%	43.88%	37.56%	54.74%	58.00%	49.50%	1.64%
목 표 (12.12.31)	45%	80%	57%	45%	37%	58%	60%	52%	5%

□□ 2014 AG 성공개최를 위한 국비 추가확보 및 지원체계 기반 구축

- 2012년 경기장 건설사업 국비 추가확보 → 450억원
 - 당초 : 871억원(국비) → 1,321억원
 - : 주경기장 건설(150억원), 신설경기장 건설(300억원)
- 2013년 주경기장 건설사업비 국비확보 → 880억원
 - 국회 제8차 문방체육위원회(2012.11.13)에서 880억원 반영
 - 국회예산결산특별위원회 상정(계수조정위원회 심의절차 진행중)
- 2014 인천AG지원법 법률개정안 국회 문방체육위원회 발의(2012. 9.11)
 - 주요골자 · 경기장 건설(75%이상), 경기장 진입도로(70%이상)
 - 국가의 지방자치단체가 발행한 지방채무의 인수
 - 국회 문방체육 법안심사소위원회 미 구성으로 현재 심의절차 보류중

□□ **AG** 관련시설 사업계획 변경신청을 통한 사업비 절감

○ 총 사업비 : (당초) 19,446억원 → (변경신청) 18,019억원

→ (심의안) 17,450억원 (감 569억원)

- 주경기장(4,900억) 및 GB훼손지 복구(388억) 국비신청 : 5,288억원
- 경명체육공원 제척(△572억원), MMC 등 기타사업(△115억원)
- 인접도시 경기장 재배치 및 사업비 조정(△29억원) 등

※ 실무심의(안) 진행중, 금년 12월 본심의 및 사업계획변경 승인예정

□□ 지역 업체 참여율 제고를 통한 지역경제 활성화

○ 지역 하도급 45%이상, 자재·인력·장비 70%이상 참여유도

- 추진실적 : 지역하도급 37%, 인력투입 92%, 장비투입 93%

□□ 재해 및 안전관리 강화로 “무재해·무사고 공사현장” 추진

○ 해빙기·우기 등 재해취약시기별 안전관리계획 수립 시행

○ 무재해·무사고 예방을 위한 안전지도 점검 확행(4회) 등

- 친환경 건축물 및 장애 없는 생활환경(BF건축물) 예비인증 획득

II. 2013년 정책여건 및 목표

□□ 정책여건

- 종목별 각 경기장에 대한 시설준공 단계로써, 시민들에게 AG 개최의지 확산 및 관심도 제고를 통한 행정신뢰도 회복시기
- 2013년 “AG 경기장의 완벽한 시설준공 실천의 해” 로 지정·운영

구 분	문학	송림	십정	계양	남동	강화	선학	옥련	주경기장
준공 예정일	'13. 7	'13. 7	'13. 8	'13. 9	'13. 9	'13.10	'14. 1	'14. 6	'14. 6

- Test Event 대회인 “제94회 전국체전” 개최관련, 2014 AG대비 시설 운영능력 및 점검차원 계기로 활용

□□ 정책목표

- 신설 경기장의 준공에 따른 준공절차 및 인수인계 준비 철저
- AG 대회지원법 개정을 통한 국비 추가확보로 시 재정부담 완화
- AG 훈련시설 개·보수에 따른 인력 재배치
 - 개보수(43개소) : 시 소유 17, 국공립학교 17, 민간 9
 - 사 업 비 : 10,088백만원
 - 재배치 예정인력 : 경기장건설 준공후 인력 재배치
- 각 경기장내 체육공원 예정지 활용방안 계획수립 시행
- 각 경기장별 안전관리 및 고품격 시공을 통한 완벽한 시설 건설
- 비치발리볼, MTB, 트라이애슬론, 마라톤 경기 등을 위한 도로 노면정비 등 실외경기장 건설 본격 추진

A·G지원본부 정책과제

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| □ AG의 성공적 개최를 위한 행정여건 조성(국비 추가확보 등) | □ 지역경제 활성화 및 일자리 창출 확대 |
| □ 안전시공을 바탕으로 완벽한 경기장 준공 | □ AG 참가국간 스포츠 및 문화교류 확대증진 |

2013년 주요업무계획

대회지원과

1. 국비확보와 소요재원의 효율적 관리
2. 2014 인천장애인아시아경기대회 준비철저
3. 「비전 2014 프로그램」 추진
4. 「남북화해 스포츠 프로그램」 활성화
5. 2014 인천AG 대회시설 건설부지 보상

1 국비확보와 소요재원의 효율적 관리

- ◇ 고품격 경기장건설 및 대회시설 인프라 구축을 위한 투자재원 확보
- ◇ 사업비 소요재원의 계획적 확보 및 효율적 관리

□□ 사업비 현황 (단위 : 억원)

구 분	최초계획 A (09.06)	타당성 재조사 (09.12)	변경 사업비('11. 5) B										B-A
			계		국비		시		민자등		인접도시		
				%		%		%		%		%	
합 계	25,805	25,783	19,446	100	3,841	20	15,190	78	390	2	25	-	△6,359
국 비 보조사업	11,652	11,630	11,864		3,691		7,758		390		25		212
국 비 비보조사업	14,153	14,153	7,582		150		7,432		-		-		△6,571

※ 2014 AG조직위원회 운영비(장애인 포함) 6,054억원 미포함

□□ 사업비 확보계획 (단위 : 억원)

구 분	계		2009까지	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	19,031	100%	2,060	4,178	1,500	2,321	5,035	3,937
국 비	3,841	20	210	678	1,000	1,321	300	332
시 비 (지방채)	15,190	80	1,850	3,500	500	1,000	4,735	3,605

※ 인접도시 25억원, 민자 390억원 제외

□□ 지방채 발행계획 (단위 : 억원)

구 분	합 계	연도별 발행 내역					향후 발행계획		
		소계	2009	2010	2011	2012	소계	2013	2014
총 발행액	15,190	6,850	1,850	3,500	500	1,000	8,340	4,735	3,605
정부자금	1,980	1,500	1,000	500			480	480	0
금융기관	13,210	5,350	850	3,000	500	1,000	7,860	4,255	3,605

□□ 2013년도 추진계획

○ 서구 주경기장 국비 추가확보 지속 추진

- 2014 인천AG 사업계획 변경절차 등을 통해 서구 주경기장 국비지원 추가확보 노력
- 총사업비 : 4,900억원(공사비 : 2,432억, 보상비 : 2,166억, 기타 : 302억)
 - 국비(30%) : 1,470억원
 - 2012년 확보(150억), 2013년(880억, 국회심의중), 2014년(440억)

※ 제18대 대통령선거이후 국회 예결위에서 증액심의 가능예상

○ 2014 인천AG지원법 법률개정을 위한 행정지원 전력 추진

- 대회지원법의 조속한 개정을 통한 평창수준의 국비지원 확보

- ▶ 주요골자 · 경기장 건설(75%이상), 경기장 진입도로(70%이상)
 - 국가의 지방자치단체가 발행한 지방채무의 인수

※ 국회문방裘 법안심사소위원회 미 구성으로 현재 심의절차 보류中
→ 제18대 대통령선거이후 본격 추진예정

○ 소요재원의 효율적 관리

- 지방채 발행시 차입선 다변화로 이자발생 최소화
 - 정부자금, 금융기관 차입금, 지방채 증권
- 사업비 소요시기에 따른 지방채 발행시기 조절
- 국비 우선투입 및 유휴자금의 효율적 관리

※ 지방채 이자 절감현황

(단위 : 억원)

구 분	총 사업비	시비	이 자		절감액	비고
			'11년기준	'12년12월 현재		
당 초 (2011. 5)	19,446	15,190	6,523	6,257	266	- 발행 시기 조정, 이자율 재협의를
변 경 (2012. 10)	17,450	13,972	6,523	5,767	756	- 총 사업비 감액

- ◇ 2014 인천AG과 연계개최를 통한 장애인스포츠 및 복지를 선도하는 국제도시 인천의 위상 정립
- ◇ 장애인과 비장애인이 함께하는 아름다운 사회 분위기 조성

□□ 대회개요

- 대회명칭 : 2014 인천장애인아시아경기대회
- 대회기간 : 2014. 10. 18 ~ 10. 24 (7일간)
- 주 최 : 아시아장애인올림픽위원회(APC)
- 규모/종목 : 41개 회원국, 선수·임원 6,000여명/ 23개 종목(예정)
- 소요예산 : 599억원(경기운영 83, 행사 93, 인력·시설 지원 288, 종합관리 135)

□□ 그동안 추진실적

- 인천2014 장애인조직위원회 설립계획 수립 : 2012. 5. 4
 - 3단계 조직구성안 마련(1총장 2차장 4본부 12부 38팀 240명)
 - 2014 인천장애인아시아경기대회 관련 자원 확보방안 등
- 2014 인천장애인조직위원회 법인 설립 : 2012. 10. 2
 - 2014 인천장애인조직위 발기인대회 및 창립총회(2012. 8. 16)
 - 2014 인천장애인아시아경기대회 개최도시 협약체결(2012. 9. 20)
 - 2014 인천장애인조직위원회 법인설립 허가(2012. 9. 21)
- 인천2014 장애인조직위원회 발족 : 총 3단계 240명
 - 인천시, 중앙부처, 공공단체의 파견인력 확보
 - 1단계 3본부 6부 18팀 80명
 - 인천2014 장애인조직위원회 개소식(2012. 10. 23)

□□ 문제점 및 대책

- 2014 인천장애인AG조직위원회 설립지연으로 인하여 대회준비를 위한 준비기간 촉박
 - 대회기간 : 2014. 10. 18 ~ 10. 24(7일간)
- ※ 조직위원회 법인등기(2012.10. 2), 조직위원회 개소식(2012.10.23)
- ⇒ 빠른 기간 내 장애인조직위원회 조직 체계정비 및 업무기능 정착
- ⇒ 시 산하공무원 및 외부기관 지원인력 조기충원 협조 강화
- ⇒ AG조직위원회와의 유기적인 업무협조를 통해 시설 및 장비의 공유체제 강화 및 주요 업무기능 조기정착 노력

※ 2014 인천장애인AG조직위원회 사무처 구성(안) : 3단계 240명
- 1단계 : 80명(현재 45명 충원)
- 2단계 : 80명('13년초 충원예정), - 3단계 : 80명('14년초 충원예정)

□□ 2013년도 추진계획

- 경기장 및 장애인 편의시설 확충
 - 대회 마스터플랜 확정에 따른 경기장 확정 : 2013. 2월
 - 론볼 경기장 및 장애인 편의시설 사업계획 수립 : 2013. 3월
 - 사업비(특별교부세) 정부지원 협의 및 확보 : 2013. 3월
- 다양한 홍보활동 전개를 통한 대시민 관심도 제고
 - 2014 장애인AG 대회기 계양(35개소) : 2013. 상반기
 - 2014 장애인AG 마스코트 조형물 순회전시 : 2013. 상반기
 - 시정소식지, 굿모닝인천 등을 활용하여 장애인AG 홍보
 - 관내·외 언론사 보도자료 등을 활용 대시민 홍보

3 「비전 2014 프로그램」 추진

- ◇ OCA 회원국의 다양한 스포츠 교류 및 지원을 통한 아시아 스포츠 균형발전 기여로 인천의 국제적 위상 제고
- ◇ 스포츠 관계자 및 국가간 긴밀한 우호협력 네트워크 구축으로 2014년 인천아시아경기대회의 성공개최 기반조성

□□ 사업개요

- 사업기간 : 2007년 ~ 2014년 (8개년)
- 사업비 : 2,000만\$ (단위 : 천\$)

연도별	계	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
금액	20,000	1,429	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857	1,429

※ 국제 부담금을 OCA로 납부하고 일부사업을 인천시에서 위탁받아 대행 추진

○ 주요사업

- 인천시 : 전지훈련, 지도자파견, 장비지원 등
 - 태권도, 레슬링, 역도, 유도, 양궁, 복싱, 사격, 수영 등
- OCA : 아시아스포츠 발전방안 모색 및 국제행사 지원 등

□□ 그동안 추진실적

- 사업비 집행액 : 2,000만\$ 중 1,571만4천\$(78.6%)
 - OCA : 10,457천\$(66.5%), 인천시 : 5,257천\$(33.5%)
- ※ 2012년도 2,857천\$: OCA 1,582천\$(55.4%), 인천시 1,275천\$(44.6%)
- 지원현황 : 29개국, 115건, 534명 (단위 : 건, 명)

구분 (연도)	합계		전지훈련						지도자파견		장비 지원	기타 (크리켓등)
			소계		단기		장기					
	건수	인원	건수	인원	건수	인원	건수	인원	건수	인원	건수	건수
계	115	534	55	514	46	496	9	18	18	20	27	15

※ 2012년도 사업 : 총 47건 중 32건 완료(추진율 68%)

- 전지훈련 참가선수 훈련성과
 - 메달획득 : 9개국 6개종목, 43명(금 10, 은 16, 동 17)
- 남북화해 협력사업 추진
 - 남북화해 스포츠 프로그램 추진을 위한 사업비 확보(27만\$)
 - 단동 축구화 구입 및 지원(7개국 928켤레)
- 훈련교류 및 문화체험
 - 각종 경기대회 참가 및 문화체험(인천투어-송도컴팩스마트시티, 월미도, 상륙작전기념관, 차이나타운 등, 기타 롯데월드 및 에버랜드 방문)
- 「비전 2014 프로그램」 홍보 등
 - 홍보 브로셔 제작배부(5,350부) : 각국 NOC, 대사관, 선수 제공
 - 홍보 동영상 CD 제작(500개) 배포 및 동영상 OCA홈페이지 게시 등

□□ 2013년도 추진계획

- 진행 중인 사업 NOC와의 협의를 통해 지속 추진
 - 총 10개국 15건 사업 : 전지훈련 9, 지도자파견 1, 장비지원 5
- 2013년도 「비전 2014 프로그램」 사업 전개
 - 2013. 3 : OCA와의 협의를 통한 사업 결정(시⇔OCA)
 - 2013. 4 : NOC로 사업 통보(시⇒NOC)
 - 2013. 5 : NOC 사업 결정 및 신청접수(NOC⇒시)
 - 2013. 5~2014. 4 : 분야별, 종목·기간 등 협의 후 추진(시⇔NOC)
- 남북화해 스포츠 교류 및 지원 추진
 - OCA와의 협력을 통한 남북화해 스포츠프로그램 사업비 지속 확보
 - NOC와의 협력을 통한 장비지원(단동 축구화) 지속 추진
 - 「남북공동 추진 TFT」를 통한 스포츠 교류 활성화 도모
- 프로그램을 통한 아시안게임 성공개최 홍보
 - 전지훈련, 장비지원, 스포츠 교류 및 지원을 통한 홍보
 - 「비전 2014 프로그램」 홍보 브로셔 등 제작 배포

4 「남북화해 스포츠 프로그램」 활성화

◇ 「비전 2014 프로그램」의 일환으로, 북한과의 스포츠교류 및 지원을 추진하여 남·북한의 상호우호 및 평화 증진에 기여하고자 함

□□ 사업개요

- 사업기간 : 2009 ~ 2014 (5개년)
- 사업비 : 639,972\$ (단위 : \$)

연도별	계	2009	2011	2012	2013	2014
금액	639,972	69,972	70,000	200,000	200,000	100,000

- 지원내용 : 전지훈련(단기, 장기), 지도자파견, 장비지원 등
- 운영방법 : T/F를 통한 협력방안 강구 및 남북 관계 여건에 맞게 추진

□□ 그동안 추진실적

- 남북 유소년축구 합동훈련 (단위 : \$, 명)

종 목	기 간	사업비	인 원	장 소	비 고
축 구	'10.1.6. ~ 1.29.	69,972	60 (남35,북25)	중국 곤명(신아시아체육성)	2009년 사업비

- 남북한 화해협력 스포츠 프로그램 사업비(200천\$) 확보
 - 「비전 2014 프로그램」 운영위원회(8차) : 2012. 3.17(토), 방콕
- 남북화해 스포츠 프로그램 추진을 위한 통일부(사회문화교류과) 방문
 - 북한과의 스포츠 교류 및 장비지원 추진 관련 협조 요청
- 단동 축구화 구입을 통한 남북협력사업 추진
 - 총 구입량(2012.12.12일 현재) : 928켤레(동티모르 외 6개국 지원)

□□ 2013년도 추진계획

- 북한지원 프로그램 사업 추진에 따른 협력방안 강구
 - 관계기관(통일부, 북측)과 실무협상 추진
 - 스포츠 장비지원 및 전지훈련 등
- 「비전 2014 프로그램」 북한 지원 사업비 지속 확보(OCA와 협력강화)
 - 실무협상을 통한 사업추진 방안 협의

- ◇ 2014 인천 아시아경기대회의 성공적 개최 지원을 위한 경기장 건설 및 도로건설 부지의 원활한 보상추진
- ◇ 신속·정확한 행정절차 이행 및 민원 최소화

□□ 사업개요

- 보상기간 : 2009. 1 ~ 2013. 12
- 규모 : 10개소, 1,314필지(1,758천㎡), 6,468억원
 - 7개 신설경기장 편입부지 : 1,239필지(1,745천㎡), 6,390억원
 - 3개 경기장 진입도로 : 75필지(13천㎡), 78억원

□□ 그동안 추진실적

(2012. 12월 현재, 단위 : ㎡, 억원)

구분	대상 (A)			실적 (B)			미보상 (A)-(B)			보상 협의율(%) 면적대비	보상금 지급률(%) 금액대비
	필지수	면적	금액	필지수	면적	금액	필지수	면적	금액		
계	1,239	1,744,929	6,389	1,208	1,707,366	6,241	31	37,563	148	97.8	97.7

□□ 2013년도 추진계획

- 경기장 및 진입도로 보상 (단위 : ㎡, 백만원)

구분	필지	면적(㎡)	보상비	비고 (보상시기)	
합계	103	47,373	20,753		
경기장	소계	31	37,563	14,800	
	남동경기장	2	118	26	(2013. 6)
	강화경기장	3	120	79	"
	옥련경기장	3	13,153	1,273	"
	체육공원 (남동,계양,선학)	23	24,172	13,422	활용계획 수립후 보상검토
진입도로	소계	72	9,810	5,953	
	강화경기장	65	9,310	5,000	(2013. 12)
	남동산단 고가차도	7	500	953	(2013. 7)

시설계획과

1. 2014 인천AG 사업계획(변경, 2차) 승인신청
2. 그린벨트(GB) 훼손지 복구사업 변경추진
3. 경기장내 체육공원 예정지 활용계획수립
4. 민간경기장 및 인접도시 대회시설 활용
5. 실외 경기장 건설
6. 방송보도시설(MMC) 설치
7. 경기장 진입로 확충 및 교차로 개선사업

- ◇ 2014 아시아경기대회의 성공적인 개최를 위한 대회관련 시설의 재배치 및 사업비 절감 등을 위하여 사업계획 변경 추진

□□ 사업개요

- 대회명칭 : 2014년 제17회 인천아시아경기대회
- 대회기간 : 2014. 9. 19 ~ 10. 4 (16일간)
- 참가규모 : OCA 회원국 45개국, 선수 및 임원 등 20,000명 이상
- 경기종목 : 36개 종목
- 대회시설 : 경기장 49개소, 훈련시설 51개소

구 분	1차 변경 승인 (‘11. 5.31)	2차변경 수정신청 (‘12.10.30)	심 의 (안)
경기장(개소)	49	49	49
인 천 시	33	34	34
신 설	16	16	16
기 존	10	11	11
민간·민자	7	7	7
인접도시	16 (8개 도시)	15 (9개 도시)	15 (9개도시)
훈련시설(개소)	54	51	51
사업비(억원)	19,446	18,019	17,450
국비 대상사업	11,864	16,432	10,543
국비 비대상사업	7,582	1,587	6,907

※ 심의(안) 사업비 : 왕산요트장 민간사업비(390억원) 등 제외

□□ 그동안 추진실적

- 사업계획변경(2차) 승인신청(‘11.10.26, ‘12. 7.18, ‘12.10.30)
 - 중앙부처 및 관련기관 지속적인 협의
 - 국제경기대회지원 실무위원회 서면심의 추진(2012.11.28)

※ 2012년 12월 본 심의 사업계획변경(2차) 승인 예정

[사업계획변경(2차) 승인신청 주요내용]

- 주 경기장 및 GB훼손지 복구 국비신청 : 5,288억원(주경기장 4,900, GB복구 388)
- 방송보도시설(MMC) 국비신청 : 32억원(국비10, 시비 22)
- 왕산요트장 진입도로 신규신청 : 증 178억원(국비 89, 시비 89)
- 신설경기장 총사업비 자율조정(낙찰차액) 결과반영 : 감 886억원
- 경명 체육공원 제척 : 절감 572억원(A=75,905m²)
- 훈련시설 일부 재배치
- 경기장 진입도로(4개소) 총사업비 조정
 - (당초) 1,242억원 → (변경) 1,198억원 (감 44억)
 - 내용 : 실시설계완료 및 조달청 설계가격 검토완료에 따른 조정
(기재부 사업비 조정승인 : 2012. 10. 29)

[실무심의(안) 주요내용]

- 주 경기장 국비보조 관련 ⇒ 사업비 전액 인천시 재정으로 추진
- 기타 시설 국비보조 관련
 - ⇒ 사업비 변경없는 시설 : 금번 사업계획변경(2차) 승인
 - ⇒ 사업비 변경시설 : 기획재정부 총사업비 협의 후 사업계획 승인

[우리 시 의견 (조건부 찬성)]

- 주 경기장 및 GB훼손지 복구 : 국비보조사업으로 승인
 - 국회예산반영(2013년 880억원), 새누리당 및 민주통합당 대선공약(국비지원)
- 기타사업 : 신청(안)으로 승인하되, 사업비는 기재부와 별도 협의

□□ 2013년도 추진계획

- 사업계획변경(3차) 승인신청
 - 신설경기장 완료에 따른 사업구역 확정 등 반영
 - 대회 관련시설(경기장, 훈련시설, 기타) 위치변경 등 변화된 여건반영
 - 설계변경 등으로 인한 사업비 변경 등

- ◇ AG 경기장 부지의 GB 해제에 따른 훼손지 복구사업비 절감 등을 위하여 복구사업계획 변경(중앙도시계획위원회 재심의) 추진

□□ 사업개요

- 근거 : 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제4조(GB해제면적의 10~20% 복구)
- 사업내용

구분	당초	변경(안)	비고
위치	갈현동 등 5개소, 142천㎡	장기 미집행공원(연희공원 등)	
사업비	846억원(중도위 심의)	580억원(감266억)	

□□ 복구사업 변경 필요성

- 복구사업비 과다 소요 및 복구효과 미흡
- 훼손시설이 대부분 주거·생업을 위한 시설로서 민원발생
- 건축물의 이축 등으로 훼손이 반복됨에 따라 불필요한 행정력과 예산을 낭비하는 결과 초래

□□ 주요 사업내용

- 훼손지 복구사업 위치 변경 및 중앙도시계획위원회 재심의를 통하여 사업비 절감 등 효율적 복구사업 추진

□□ 그동안 추진실적

- 2009. 2 : 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별법」 개정
- 2012. 8 : 중도위 재심의 추진 실무협의(국토부)
- 2012. 11 : 훼손지 복구계획 변경 용역 착수
 - 용역기간 : 2012. 11 ~ 2013. 2(10백만원)
 - 과업내용 : 현황조사, 중앙도시계획위원회 심의안건 작성 등

□□ 2013년도 추진계획

- 2013. 2 : 국토부 협의 및 중앙도시계획위원회 재심의

3 경기장내 체육공원 예정지 활용계획 수립

◇ 계양, 남동, 선학 경기장 부지중 체육공원 예정지에 수익시설을 검토하여 경기장 적자운영 최소화 도모

□□ 사업개요 (단위 : m²)

구 분	경 기 장 전체면적	운 동 장 (체 육 시설)	체 육 공원	비 고
계	1,084,841	662,875	421,966	계양, 남동, 선학

- 체육공원 예정지 개발의 필요성
 - 현재, 체육공원은 야외 선수훈련시설과 생활체육시설 등으로 계획되어 경기장 운영비 충당을 위한 수익시설 미 반영
 - 경기장과 연계 수익시설 확충으로 사후 운영적자 예방 및 입지시설 재검토하여 토지이용 극대화 방안 강구

□□ 그동안 추진실적

- 2012. 9 : 경기장내 체육공원부지 활용계획 수립
- 2012. 10 : 「2025 인천도시기본계획」 반영
- 2012. 12 : 용역비 확보(2013년도 본예산 편성 : 98,227천원)
 - 용역명 : AG 경기장내 체육공원 예정지 개발 타당성조사 용역
 - 과업내용 : 개발 컨셉 및 도입시설 결정, 마케팅 전략 수립 등

□□ 2013년도 추진계획

- 2013. 1~6 : 용역 착수 및 완료
- 2013. 7 : 도시관리계획 변경 등 행정절차 추진
 - ※ 도시관리계획 변경 등을 위한 용역 : 별도시행 필요

- ◇ 수도권 쓰레기매립지 드림파크 조성사업과 연계한 경기장 건설
- ◇ 2014 인천AG 개최에 따른 사업비 재원 부담해소와 화합된 경기 개최를 위하여 민간 및 인접도시 경기장·훈련시설 활용

[드림파크 경기장 건설]

□□ 사업개요

- 사업기간 : 2010. 2 ~ 2014. 6
- 위 치 : 인천광역시 서구 수도권매립지
- 시 행 자 : 수도권매립지 관리공사
- 사업내용 : 골프, 수영(수구), 승마, 사격(클레이), 근대5종
(단위 : 억원)

구 분	계	골 프	수영(수구)	승 마	사격 (클레이)	근대5종 (투척)
사업비	1,734	733	437	475	89	-
규 모	-	골프코스 (36홀)	수영장	승마장	일반사대 (5개)	기존 경기장활용

□□ 그동안 추진실적

- 2009. 6. 23 : 사업계획 승인(문체부)
- 2010. 9. 6 : 골프장 공사 착공
- 2012. 10. 26 : 수영, 승마장 공사 착공

□□ 2013년도 추진계획

- 2013. 2 : 클레이사격장 사업비 확보
- 매립지 적립금 또는 주민지원기금 활용 협의중(협조 : 시 청소과)
- 2013. 3 : 골프장 준공
- 2014. 6 : 수영, 승마장 준공

[민간·인접도시 대회시설 개·보수]

□□ 사업개요

○ 개·보수 대상 및 사업비 (단위 : 개소, 백만원)

구분	개소	사업비	대상	비고
합계	27	4,991		
인접도시 시설	18 (9개 도시)	1,185 (국비 356) (시비 364) (지자체 465)	경기장(15) 훈련시설(3)	
관내 민간 훈련시설	9	3,806 (국비 1,142) (시비 2,664)	경기장(1) 훈련시설(8)	외부기관(4) 사립학교(5)

□□ 그동안 추진실적

- 2009. 6.23 : 사업계획 승인(문체부)
- 2011. 5.31 : 사업계획 변경(1차) 승인(문체부)
- 2011.10.26 : 사업계획 변경(2차) 승인 신청
- **2012. 7.11 : 인접도시 시설 배치계획 변경 및 사업비 확정**
- 사업비 : **4,122백만원 → 1,185백만원(감 2,937백만원)**

□□ 2013년도 추진계획

- 인접도시 경기장 개·보수
 - 2013. 1 : 사업비 전출(인천시→AG조직위원회)
 - 2013. 2 ~ 2013. 7 : 실시설계 및 시행자사업계획 승인
 - 2013. 8 ~ 2014. 8 : 공사 착공 및 준공
- 관내 민간훈련시설 개·보수
 - 2013. 3 ~ 2013.11 : 실시설계 및 시행자사업계획 승인
 - 2013.12 ~ 2014. 8 : 공사 착공 및 준공

◇ 마라톤 경기 등을 위한 도로 노면정비, MTB(산악자전거), 비치발리볼, 트라이애슬론 등 실외 경기장 설치

□□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 3 ~ 2014. 8
- 위 치 : 인천광역시 관내
- 사 업 비 : 9,998백만원 (국비 2,999, 시비 6,999)
- 사업내용 : 도로노면보수, MTB, 비치발리볼, 트라이애슬론
(단위 : 백만원)

구 분	계	도로경기종목 도로노면정비	MTB (Mountain Bike)	비치발리볼	트라이애슬론
위 치	-	송도~청라 ~주경기장	강화 덕정산	문학경기장	송도국제도시
사 업 규 모	-	총연장 72.96km (마라톤, 사이클, 트라이애슬론)	크로스 컨트리 L=6km, B=2m	6코트 (메인1코트, 연습5코트)	수영 1.5km, 사이클 40km, 달리기 10km
사업비 (백만원)	9,998 국비 2,999 시비 6,999	8,347	743	542	366
시행기관		종합건설본부	AG 지원본부		

□□ 그동안 추진실적

- 2009. 6. 23 : 사업계획 승인(문체부)
- 2011. 5. 31 : 사업계획변경(1차) 승인(문체부)
- 2011.10. 26 : 사업계획변경(2차) 승인 신청

□□ 2013년도 추진계획

- 2013. 1 ~ 2013. 2 : 현장조사 및 관계자 업무협의
- 2013. 3 ~ 2013. 7 : 실시설계 및 시행자사업계획 승인
- 2013. 8 ~ 2014. 8 : 공사 착공 및 준공

6 방송보도시설(MMC) 설치

◇ 방송, 취재 및 보도활동을 지원하고 최적의 미디어 시설을 구축하기 위하여 방송보도시설(MMC) 설치

□□ 사업개요

- MMC(방송보도시설) : IBC(국제방송센터) + MPC(보도시설)
(단위 : m², 백만원)

구 분	M M C (Main Media Center)		
	계	I B C (International Broadcasting Center)	M P C (Main Press Center)
위 치	-	송도컨벤시아 1단계	송도게일사 건물 (사무소, 모텔하우스)
면 적	20,800	9,600	11,200
사업비	3,254	-	3,254

□□ 그동안 추진실적

- 2011. 5. 31 : 사업계획변경(1차) 승인
- 2011. 10. 26 : 사업계획변경(2차) 승인 신청
- **2012. 6. 13 : 협약서 체결(AG본부+AG조직위+경제청+게일사)**
 - 게일사 건물 무상사용 및 원상복구 없이 반환
 - 예산절감 : 138억원(원상복구비 102, 건물임차비 36)

□□ 2013년도 추진계획

- 2013. 1 ~ 2013. 2 : 현장조사 및 관계자 업무협의
- 2013. 3 ~ 2013.11 : 실시설계 및 시행자사업계획 승인
- 2013.12 ~ 2014. 4 : 공사 착공 및 준공

◇ 남동산단 입구 사거리 입체화 및 경기장 진입로를 확충하여 교통난 해소와 AG 경기장 접근성 향상 도모

□□ 사업개요

사업명	사업규모	사업비 (억원)	사업기간	추진상황	
				착공	현공정율
계		1,215			
남동산단 고가차도	6차로, L=800m	376	'12.09 ~ '14.09	'12. 9.18	0.6%
선학경기장 진입로	4차로, L=236m	77	'12.08 ~ '13.11	'12. 8.29	8.8%
매소홀로 (구 관교로)	6차로, L=1.3Km (구월보금자리구간 제외)	646	'12.05 ~ '14.09	'12. 5.31	4.5%
강화경기장 진입로	4차로, L=1.27km	116	'13.03 ~ '14.08	미착공	-

※ 매소홀로 : 종합건설본부 시행, 구월보금자리구간(L=1Km, 300억원)은 도시공사 시행

※ 강화 진입로 : 노선변경으로 인한 실시설계 검토중

- 송해면 ~ 강화경기장(1.1km, 4차로) → 강화읍 ~ 강화경기장(1.27km, 4차로)

□□ 2013년도 추진계획

사업명	2013년 목표	비고
선학경기장 진입로 개설공사	공사준공(11월)	
남동산단 고가차도 건설공사	공정률(60.5%)	2014. 9. 준공
매소홀로 개설공사	공정률(72.0%)	2014. 9. 준공
강화경기장 진입로 확포장 공사	공정률(50.0%)	2014. 8. 준공

주경기장조성과

1. 서구 주경기장 건설사업
2. 강화 경기장 건설사업
3. 선수촌 및 미디어촌 건설사업
4. AG 기존 경기장 개·보수 사업 추진
5. AG경기장 준공이후 훈련시설(43개소) 개·보수

- ◇ 국제 수준의 최첨단 고품격 경기장을 건설하여 2014 인천AG에 성공적 개최지원 및 도시균형발전 도모

□□ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 서구 연희동 378번지 일원
- 규 모 : 부지 631,975m², 연면적 113,620m², 관람석 6만석
- 사업내용 : 개·폐회식 및 육상경기 등
- 사업비 : 489,997백만원
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2014. 6 (*2014. 4월 건축공사 준공예정)

□□ 그동안 추진실적

(1) 주경기장 실시설계 : 2011. 3월 완료

(2) 주경기장 토사확보

- 소요토사 2,346천m³ 확보 및 토공사 완료



(3) 주경기장 건설공사 추진

- 공 정 률 : 40.86% (*2012.12.10 현재)
- 공사추진 내용
 - 주경기장 2층 및 보조경기장 골조공사 완료
 - 소나무 등 교목 9종 316주 식재
 - 지열공사 천공 및 외부배관 완료
- 공기단축 T/F팀 운영(회의개최) : 4회



(4) 사후 환경영향평가

- 용역기간 : 2011. 7.14 ~ 2014.10.25 (64개월, 199,500천원)
- 용역내용
 - 공사시행으로 인하여 영향을 받을 수 있는 환경항목에 대하여 사업 시행 전·후의 환경변화를 분기별로 조사·분석
- 추진실적 : 조사·분석 6회 실시, 특이사항 없음

※ 주요 인사 현장방문

- AG주경기장 국비지원 당위성, 공사진행 업무보고 등 : 18회



민주통합당 대통령 후보(2012. 8.16)



새누리당 대통령 후보(2012.11.29)

□□ 2013년도 추진계획

(1) 건설사업관리(CM)용역

- 2013. 1 ~ 12월
 - 도면승인, 검측, 자재승인, 공정 등 관리하여 주경기장 품질 및 공기확보와 안전시공
- 감리원 투입 : 공정에 따라 최대 16명 배치
 - 책임기술자1, 건축5, 토목1, 기계3, 전기3, 통신1, 소방1, 조경1

(2) 주경기장 건설공사 추진

구 분	2013년				2014년	비고
	1분기	2분기	3분기	4분기		
계 획 공 정 률	54%	65%	76%	87%	100%	

- 건축, 전기, 통신 분야 본격적인 공사 시행
 - 골조공사, 지붕공사, PC스탠드설치, 도로, 그라운드 조성, 수목 식재 및 조경시설물 설치, 전광판, 방송음향, CCTV 제작 설치
- 크리켓경기장
 - 그라운드 조성 완료, 임시시설물 2014년 1분기 설치
- 안전시공 및 절대공기 확보 노력
 - 안전시공 : 정기안전교육 12회(월 1회), 안전감시단(5명) 연중 운영
 - 절대공기 확보 : 장마·폭설 등으로 인한 공기지연 대비, 공기 단축 T/F팀 운영⇒ 분기별 1회 선행공정 검토 등

○ 2014. 4월 : 주경기장 건설공사 준공(예정)

(3) 사후환경영향평가

- 영향조사 : 분기별 1회 실시 (연간 4회)
- 조사대상
 - 사업지내 대기질 변화, 온실가스 발생, 수질오염, 소음, 진동 발생 등
- 조사·분석 결과 기준치 초과 등 발생시 저감방안 수립 시행

- ◇ 2014 아시아경기대회의 성공적인 개최를 위하여 태권도/탁구 및 BMX(사이클) 경기장 확보
- ◇ 고품격·친환경적인 경기장 건설로 강화지역 체육시설 인프라 확충

□□ 사업개요

- 위 치 : 강화군 강화읍 국화리 46-2번지 일원
- 규 모
 - 대지면적 : 76,997m²
 - 실내 체육관 [태권도/탁구]
 - 층수 : 지상3층(지하2층) / 연면적 : 16,200m² / 관람석 : 4,014석
 - 실외 경기장 [BMX(사이클)]
 - 층수 : 지상2층(지하1층) / 연면적 : 2,546m² / 관람석수 : 1,010석
- 공사기간 : 2011. 9 ~ 2013. 10
- 사업비 : 83,868백만원
- 시 공 자 : 계룡건설 외 2개사

□□ 그동안 추진실적

(1) 강화 경기장 건설사업 추진

- 2011. 9. 21 : 공사착공
- 2012. 5. 31 : 지하층 골조공사 완료
- 2012. 12.10 기준 : 공정률 49.50%
 - 건축공사 : 골조공사 및 PC스탠드 설치 완료
 - 토목공사 : 우·오수관 매설
 - 전기/통신 : 케이블, 배관 설치

(2) 건설사업관리(CM)용역

- 시공 검측 및 자재 승인을 통한 경기장 품질 확보
 - ※ 감리원 투입 : 공정에 따라 최대 8명 배치
- 대회 준비를 위한 공기확보·건설현장 안전관리 등

(3) 예산절감을 위한 설계변경 추진

- 우수계획 변경을 통하여 관거(PC박스) 미설치 : 71백만원
- 타 공사장의 반출토사 확보(무대)로 성토비용 절감 : 90백만원

(4) 군진지 이전 협의완료

- 경기장 건설로 기능이 상실되는 군진지 이전계획 수립 (군부대 사업계획 승인조건)
- 경기장부지 경계로 이전 결정

□□ 2013년도 추진계획

(1) 건설사업관리(CM)용역 : 2013. 1월 ~ 10월

- 시공검측 및 자재승인 등을 통한 경기장 품질확보/준공검사
- 공기확보 및 건설현장 안전관리

(2) 강화 경기장 건설공사 추진

- 공정 진행상황

구 분	2013년도				비고
	3월	6월	9월	10월	
공정률	68%	86%	99% (건축 준공)	100% (전기/통신 준공)	

- 공정별 세부시행 사항

- 건축분야(토목, 조경포함) : 철골, 미장, 지붕, 포장, 식재공사 완료
- 전기분야 : 발전기, 조명, 배선기구 설치 완료 및 시운전
- 통신분야 : 배관, 배선공사 완료 및 시운전

(3) 공기단축 : 동절기 및 우기(장마)시 공사지연 사전대비

(4) 지역업체 활성화 : 인력, 장비 및 자재 지역 업체 우선 선정독려

(5) 친환경건축물 · BF(장애없는 생활환경)건축물 인증

◇ 2014 인천아시아경기대회 선수촌·미디어촌을 인천 도시공사에서 시행하는 구월보금자리 주택지구를 활용 예산절감 및 쾌적하고 안락한 숙소를 제공하고자 함.

□□ 사업개요

- 사업기간 : 2010. 5 ~ 2014. 11
- 위 치 : 남동구 구월동·수산동 일원(구월보금자리주택지구내)
- 면 적 : 840,907m² (254천평)
- 선수촌·미디어촌 사용 세대수 : 3,367세대

《선수촌》

- 주거구역 : 2,220세대
- 국제구역 : 학교부지, 근린공원 등 부지 활용(면적 : 75,323m²)
- 공공구역 : 영구임대아파트 부지 활용(면적 37,330m²)

《미디어촌》 : 주거구역 : 1,147세대

□□ 그동안 추진실적

- 2010.11.18 : 구월보금자리주택 대체활용 계획 방침
- 2012. 3. 8 : 선수촌·미디어촌 사용협약 체결(시~조직위~공사)
- 2012. 3.23 : 구월 아시아드 선수촌 건설사업 착공식
- 2012.12.10 현재 : 공정률(16.47%)

□□ 2013년도 추진계획

- 2013. 10 : 골조공사 완료
- 2013. 12 : 마감공사 완료
- 2014. 6 : 임시사용 승인
- 2014. 7. 7 : 선수촌·미디어촌 인계(도시공사→AG조직위)

- ◇ 2014 AG의 성공적 개최를 위해 기존 경기장을 국제공인 기준에 적합하게 개·보수하여 활용, 경제적·효율적인 대회기반 구축

□□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	사업비	사업개요
계	17,758	
계양사이클경기장 개·보수	13,784	· 종 목 : 사이클 · 트랙길이 : 333m · 공사내역 : 관람석1,508 부대시설3,297㎡
도원체육관 개·보수	3,273	· 종 목 : 유도, 레슬링 · 연 면 적 : 7,768㎡ · 공사내역 : 화장실, 샤워장보수, 방수공사등
선학빙상경기장 개·보수	701	· 종 목 : 핸드볼 · 설치면적 : 3,388㎡ · 공사내역 : 바닥판 설치·해체공사

□□ 그동안 추진실적

- 계양 사이클경기장 개·보수사업
 - 2012. 4. 19 : 설계용역 착수
 - 2012.10. 17 : 설계자문위원회 개최
- 도원체육관 개·보수사업
 - 2012. 3~4 : 관계기관 협의 및 합동조사

□□ 2013년도 추진계획

- 2013. 3 ~ 2013. 9 : 도원체육관 설계용역
- 2013.12 ~ 2014. 6 : 도원체육관 개·보수공사
- 2013. 3 ~ 2014. 6 : 계양 사이클경기장 개·보수공사
- 2014. 3 ~ 2014. 6 : 선학빙상경기장 개·보수공사

5 AG 경기장 준공이후 훈련시설(43개소) 개보수

- ◇ AG 훈련시설 개·보수사업의 원활한 추진을 위해 경기장 건설 준공이후 건설부문 인력을 개·보수사업 현장에 투입함으로써 건설한 시공을 통한 최적의 시설 제공
- ◇ 인천 전역에 분포되어 있는 시설을 권역별로 구분하여 사업 추진

□□ 사업개요

○ 훈련시설 현황

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	개·보수 대상 현황				비고
		계	시 소유	국·공립학교	민간시설	
계	10,088 (국비 3,026) (시비 7,062)	43	17	17	9	

□□ 문제점 및 대책

- 개·보수 대상 훈련시설 과다 및 인천 전 지역으로 분포되어 있어 개·보수 인력부족에 따라 업무 효율성 저하
- 경기장 준공이후 건설부문 인력을 개·보수 사업에 투입
 - 경기장별 준공예정일

구 분	계	문학	송림	십정	계양	남동	강화	선학	옥련	주경기장
준공 예정일	-	'13. 7	'13. 7	'13. 8	'13. 9	'13. 9	'13.10	'14. 1	'14. 6	'14. 6

- 훈련시설 개·보수 사업은 2013년 설계완료, 2014년 6월 보수 사업 완료목표로 추진하고 있어 2013년 경기장 건설사업의 순차적 완료에 따른 건설부문 인력을 설계 및 보수 공사에 투입
- 인천 전역에 분포되어 있는 시설을 권역별로 구분하여 사업추진
 - 5개 권역별 구분

계	1권역 (중,동,남구)	2권역 (연수구)	3권역 (남,남동구)	4권역 (부평,계양,서구)	5권역 (민간시설)	비고
43개소	7개소	10개소	9개소	8개소	9개소	

□□ 2013년도 추진계획

- 2013. 2월 : 개·보수 종합계획 수립
- 2013. 3~4월 : 개·보수 대상시설 현장조사 및 시설소유주(관리자) 협의
- 2013. 10월 : 설계용역 완료
- 2014. 06월 : 개·보수공사 합동 추진 완료

경기장건설과

1. 2014 AG 종목별 경기장 건설사업 추진

- ① 문학수영장 건설
- ② 송림경기장 건설
- ③ 십정 경기장 건설
- ④ 선학 경기장 건설
- ⑤ 계양 경기장 건설
- ⑥ 남동 경기장 건설
- ⑦ 옥련 사격장 건설

2 2014 AG 경기장별 미술작품 제작·설치

- ◇ 철저한 공정 및 품질 관리로 국제적 수준의 차질 없는 2014 인천 아시아경기대회 시설 준비
- ◇ 완벽한 체육시설 인프라 확충으로 각종 국제대회 유치 및 기반 시설 확보

□□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 4 ~ 2014. 6

○ 사업규모

(단위 : m² / 억원)

구 분	대지면적	연면적	사업비	개 최 종 목
계	1,376,513	157,574	10,178	
문학수영장	18,600	18,194	408	수영
송림경기장	29,643	22,734	545	배구
십정경기장	143,477	26,723	1,650	테니스/스쿼시
선학경기장	441,659	13,154	2,580	하키, 복싱
계양경기장	382,825	24,421	2,061	양궁, 배드민턴/공수도
남동경기장	263,747	42,357	2,579	럭비, 체조
옥련사격장	96,562	9,991	355	사격

□□ 그동안 추진실적

(1) 공정계획에 따른 건설공사 정상추진(12.12.31일 기준 공정률 49%)

구 분	추진 공정	목 표 공정률(%)	비고
문학수영장	지붕공사 및 마감공사	80	
송림경기장	지붕 및 외벽 판넬공사, 내부 마감공사	57	
십정경기장	지붕철골공사, 방수·조적공사	45	
선학경기장	골조 및 관람석 설치공사	37	
계양경기장	골조 및 조적공사	58	
남동경기장	골조 및 외벽 판넬공사	60	
옥련사격장	관리동 골조공사 및 토사반출	5	

(2) 지역 건설 산업 활성화 추진

○ 지역 하도급업체 참여 및 인력·장비투입 현황

(2012.12.10 기준, 단위 : 백만원, 명/대)

경기장	하도급업체 선정					인력투입			장비투입		
	업체수		하도급액			전체	관내 거주	비율	전체	관내 등록	비율
	전체	인천	전체	인천	비율						
전체	119	52	151,087	55,696	36.9	194,642	179,916	92.4	19,001	17,638	92.8

○ 지역건설업체 초청 간담회(2012. 1.11)

- 참석자 : 정무부시장, AG지원본부장, 건설사 대표 등 30명
- 주요내용
 - 대회개최에 차질 없는 공정관리와 양질의 경기장 건설 당부
 - 향후, 하도급 참여 확대 등 건설 산업 활성화 방안 논의

□□ 2013년도 추진계획

- 철저한 공정관리로 차질 없는 대회 시설 준비
 - 문학·송림(2013. 7), 십정(2013. 8), 계양·남동(2013. 9)
 - 선학(2013. 7), 옥련(2014. 6)
- 2014 인천AG 붐 조성 및 시민화합을 위한 준공식 개최(예정)
- 친환경 및 무장애(BF) 건축물 본 인증 취득(완공 후)
- 시설물 유지관리 전수·인계로 전국체전 개최 지원

[1] 문학수영장 건설 [수영]

- 위 치 : 인천. 남구 문학동 515번지 일원(문학경기장 내)
- 규 모 - 대지/연면적 : 18,600㎡ / 18,194㎡
 - 층수/관람석 : 지하1~지상3층 / 3,006석
- 사 업 비 : 40,757백만원 (국비 12,227, 시비 28,530)
- 공사기간 : 2011. 4.19 ~ 2013. 7.19
- 시 공 사 : 대우건설
- ※ 2012.12월말 목표 공정률(80%) : 골조공사 완료




[2] 송림경기장 건설 [배구]

- 위 치 : 인천. 동구 송림동 11-16번지
- 규 모 - 대지/연면적 : 29,643㎡ / 22,734㎡
 - 층수/관람석 : 지하2~지상3층 / 5,009석
- 사 업 비 : 54,500백만원 (국비 12,173, 시비 42,327)
- 공사기간 : 2011. 5.19 ~ 2013. 7.19
- 시 공 사 : GS건설
- ※ 2012.12월말 목표 공정률(57%) : 골조 및 PC 공사 완료



[3] 십정경기장 건설 [테니스/스쿼시]

- 위 치 : 인천. 부평구 십정동 101-2번지 일원
- 규 모 - 대지/연면적 : 143,477㎡ / 26,723㎡
 - 층수/관람석 : 지하2~지상4층 / 7,077석
- 사 업 비 : 164,965백만원 (국비 49,490, 시비 115,475)
- 공사기간 : 2011. 5.19 ~ 2013. 8.18
- 시 공 사 : 한화건설
- ※ 2012.12월말 목표 공정률(45%) : 골조공사 완료

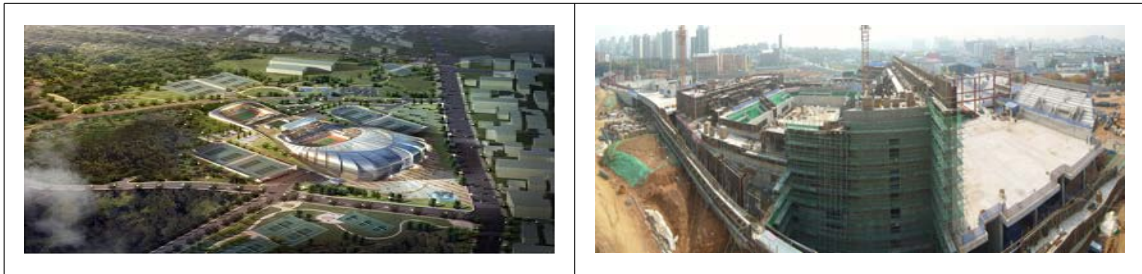

[4] 선학경기장 건설 [하키, 복싱]

- 위 치 : 인천. 연수구 선학동 83번지 일원
- 규 모 - 대지/연면적 : 441,659㎡ / 13,154㎡
 - 하키경기장 : 지하1~지상3층 / 8,115석
 - 다목적체육관 : 지하1~지상3층 / 2,104석
- 사 업 비 : 257,977백만원 (국비 51,868, 시비 206,109)
- 공사기간 : 2011.10.19 ~ 2014. 1.31
- 시 공 사 : 한진중공업
- ※ 2012.12월말 목표 공정률(37%) : 골조공사 진행



[5] 계양경기장 건설 [배드민턴, 양궁]

- 위 치 : 인천. 계양구 서운동 111번지 일원
- 규 모 - 대지/연면적 : 382,825㎡ / 24,421㎡
 - 배드민턴경기장 : 지하2~지상3층 / 4,304석
 - 양궁경기장 : 지하1~지상3층 / 1,181석
- 사 업 비 : 206,157백만원 (국비 54,470, 시비 151,687)
- 공사기간 : 2011. 5.19 ~ 2013. 9.17
- 시 공 사 : 태영건설
 - ※ 2012.12월말 목표 공정률(58%) : 골조공사 진행



[6] 남동경기장 건설 [체조, 럭비]

- 위 치 : 인천. 남동구 수산동 409-1번지 일원
- 규 모 - 대지/연면적 : 263,747㎡ / 42,357㎡
 - 체조경기장 : 지하2~지상3층 / 8,874석
 - 럭비경기장 : 지상3층 / 5,038석
- 사 업 비 : 257,872백만원 (국비 66,813, 시비 191,059)
- 공사기간 : 2011. 5.19 ~ 2013. 9.17
- 시 공 사 : 계룡건설
 - ※ 2012.12월말 목표 공정률(60%) : 골조공사 진행



[7] 옥련 실내사격장 건설 [사격]

- 위 치 : 인천. 연수구 옥련동 산 36번지 일원
- 규 모 - 대지/연면적 : 96,562㎡ / 9,991㎡
 - 층수/관람석 : 지상4층 / 1,337석
- 사 업 비 : 35,500백만원 (국비 10,650, 시비 24,850)
- 사업기간 : 2012. 9.18 ~ 2014. 6.20
- 시 공 사 : 티오피종합건설
 - ※ 2012.12월말 목표 공정률(5%) : 관리동 골조공사



- ◇ 2014 인천AG 경기장 이미지를 부각시키고 옥외 공간 조화와 예술성을 갖춘 경기장 건설로 경기장을 찾는 시민들이 만족할 수 있는 최적의 상징적 미술작품 설치

□□ 사업개요

- 사업대상 : 문학, 송림, 십정, 계양, 남동, 강화, 선학경기장
- 사업기간 : 2012. 9 ~ 2013. 6
- 소요예산 : 2,109백만원
- 사업규모 (단위 : m² / 천원)

구 분		문 학	송 립	십 정	계 양	남 동	강 화	선 학
금 액	합 계	244,386	252,928	360,524	361,323	478,748	215,438	195,731
	조형물	244,386	252,928	306,524	307,323	398,748	215,438	195,731
	회화등	-	-	54,000	54,000	80,000	-	-
분 야		조형물 1	조형물 1	조형물 1 회화등 1	조형물 1 회화등 1	조형물 1 회화등 2	조형물 1	조형물 1

※ 조형물은 전국 공모, 회화는 지역제한

□□ 그동안 추진실적

- 2012. 9.26 : 2014인천AG경기장 미술작품 설치계획
- 2012.10.15 : 2014인천AG경기장 미술작품 제작·설치 공모 공고
- 2012.10.23~10.24 : 응모신청서 접수
- 2012.11.28~11.29 : 작품접수(입체조형물 : 59, 회화 등 23)
- 2012.12.11 : 2014인천AG경기장 미술작품 심사위원회 개최
- ※ 7개 경기장 9개 작품 선정(조형 7, 회화 2)

□□ 향후 추진계획

- 2012. 12 : 인천광역시 미술작품 심의위원회
- 2013. 3~6 : 제작 착수 및 설치


《 2014 인천AG 경기장별 미술장식품 선정작품 》



문학수영장
 <류호열(성남), 작품명 : 승리의 역영>




송림경기장
 <박종재(고양), 작품명 : 스파이크서비스>

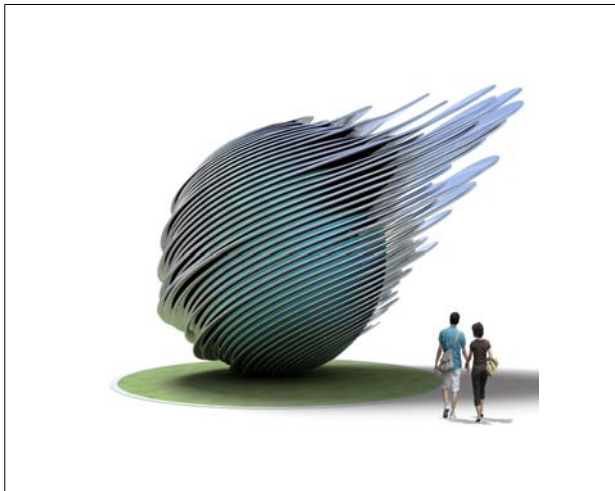


십정경기장
 <윤재경(서울), 작품명 : Rush>



계양경기장
 <정의지(상주), 작품명 : Happy Day>

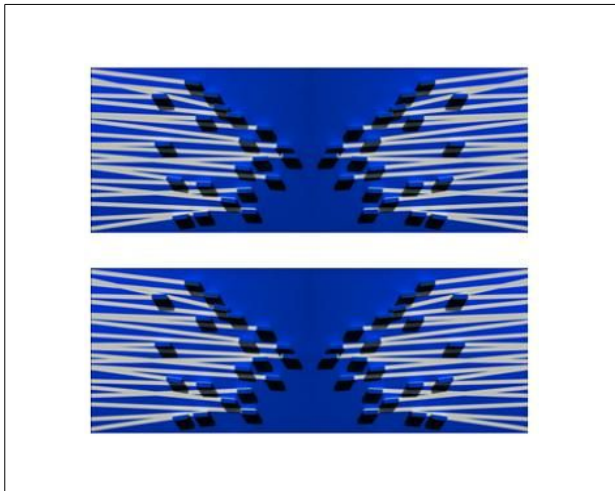

계양경기장
 <이계원(인천) 작품명 : 공기를 가르며>

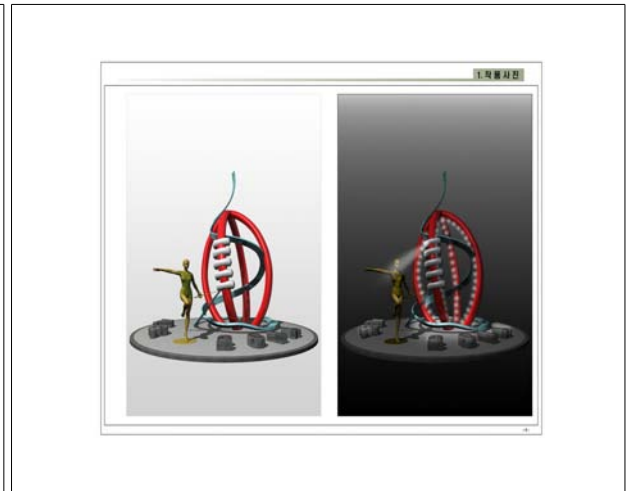

남동경기장
 <김길남(인천), 작품명 : AG 2014 리듬터치다운>

《 2014 인천AG 경기장별 미술장식품 선정작품 》



남동경기장
<민은숙(인천), 작품명 : 어울림>



강화경기장
<김창곤(인천), 작품명 : 열린세상>



선학경기장
<이영선(서울), 작품명 : 휴식 REST>



미술작품 심사전경
