

대한민국의 심장 경제수도 인천

# 2014 주요업무계획



**[아시아경기대회지원본부]**

# 보고 순서

I. 2013년 추진성과와 반성	
1. 추진성과 (잘한 점) .....	1
2. 반성할 점 .....	3
II. 2014년 정책여건 및 목표	
1. 정책여건 및 목표 .....	4
III. 2014년 주요업무계획	
[ 대회지원과 ]	
1. 2014 인천 AG 국비확보 지속추진 .....	7
2. 소요재원의 안정적 확보와 효율적 관리 .....	9
3. 경기장 개·보수 및 지역 건설경기 활성화 .....	11
4. 인천 비전 2014프로그램 운영 .....	13
[ 시설계획과 ]	
1. 대회관련시설 사업계획 변경승인 추진 .....	16
2. 민간경기장 및 인접도시 대회시설 활용 .....	18
3. 실외 경기장 건설 .....	20
4. 방송 보도시설(MMC) 설치 .....	21
5. 경기장진입로 확충 및 교차로 개선사업 .....	22
[ 주경기장조성과 ]	
1. 서구 주경기장 건설사업 .....	24
2. 주경기장 미술작품 제작·설치 .....	26
3. 선수촌 및 미디어촌 건설사업 .....	29
4. AG 기존 경기장 개·보수 사업 .....	30
5. AG 훈련시설 개·보수 사업 .....	31
[ 경기장건설과 ]	
1. AG 훈련시설 개·보수 사업 .....	33
2. 선학경기장 건설사업 .....	35
3. 옥련 실내사격장 건설 .....	36
4. 장애물 없는 생활환경(BF) 인증획득 .....	37

# I . 2013년 추진성과와 반성

1

## 추진 성과 (잘한 점)

- ◇ 2013년은 “AG경기장의 완벽한 시설준공 실천의 해” 로써, 남동 경기장 등 6개 경기장에 대한 준공식을 지역주민과 함께하는 화합 및 축제의 장으로 승화시켰으며,
- ◇ 2014 인천 AG의 개·폐회식 등 성공적인 대회를 지원하기 위한 국제수준의 최첨단·고품격 주경기장 건설에 매진하고 있음.
- ◇ 국회 및 정부를 상대로 AG 주경기장의 “국고지원의 형평성과 당위성” 에 대한 지속적인 설득 및 지원 요청으로 공감대가 형성되어 국비확보에 대한 전망을 한층 밝게 하였고,
- ◇ 2014 인천 AG총사업비 조정(6차)결과 신규 및 추가사업 반영(증액), 예산절감 등 목표성과를 달성하였으며,
- ◇ 아시아 스포츠계에서 우수 사업으로 인정받고 있는 『비전 2014 프로그램』 을 매개체로 각국 NOC와 우호관계를 형성하여 인천의 국제적 위상 제고라는 시너지 효과도 거두고 있음.

### □ 2014 인천 AG 성공개최를 위한 국비 추가확보 노력

- 2014년도 주경기장 건설국비 추가요구 ⇒ 389억원
  - 2014년도 우리시 지원 요구액 : 800억원
  - 2014년도 정부예산(안) 반영액 : 411억원
  - 국회를 통한 패널티에 따른 국비 24% 지원의 불합리성 및 기준보조율 30%에 근거한 건설국비 추가분의 내년도 예산 반영을 요청
- 대회지원법 개정을 통한 국비추가 확보 시 조기(년초)배정 요청

## □ 비전 2014 프로그램을 통한 인천의 국제적 위상 제고

- 아시아 스포츠 균형발전에 기여 및 남·북한 평화증진 도모
  - 전지훈련(69건, 631명), 지도자 파견(20건, 22명), 장비지원(58건)
  - 북한 사업비 확보(790천\$), 단둥 축구화 구입·지원(요르단 등 10개국, 1,898켤레)
- OCA·NOC와의 우호협력 증진 및 비전 프로그램을 통한 인천 AG홍보
  - 2014년 이후, 지속운영 합의(유산 프로그램 운영)
  - NOC와의 회담을 통한 AG 참여 유도(NOC 주요인사 초청 : 14개국, 28명)
  - 홍보 브로셔(,5,750부) 및 동영상(600개)제작 ⇒ NOC·재외공관 제공

## □ 2014 인천 AG총사업비 조정(6차) 심의결과 국비추가 확보

- 총사업비 조정(6차)결과 신규 및 추가사업 반영 증액 : 369억원
  - 왕산요트 경기장 진입도로(신규) 외 8개 사업 ⇒ 국비 41억원 추가확보
- 경기장 및 훈련시설 재배치로 사업비 절감 : 371억원
  - 도로경기 종목 코스변경 및 훈련시설 위치변경 ⇒ 신축을 기존시설로 대체

## □ 그린벨트(G.B) 훼손지 복구계획 변경 시행

- 중앙도시계획위원회 변경 심의 요구(2013. 11. 28 국토부)
  - 당 초 : 계양구 갈현동 외 5개소(사업비 846억원)
  - 변 경 : 연희공원 외 2개소(사업비 440억원)
  - 면적조정 : 142,417m<sup>2</sup> → 85,564m<sup>2</sup> + 보전부담금 95억원(51,451m<sup>2</sup>)
- ※ 훼손지 복구계획 대상지역 변경으로 사업비 절감 ⇒ 406억원

## □ 경기장 건설공사 공정 및 품질관리 철저

- 남동 경기장 등 6개 경기장 건설공사의 추진에 공정 및 품질관리에 노력하여 국제수준의 우수한 경기장을 조성
- 준공 경기장을 전국체전 경기장으로 활용하여 인천 체육발전에 기여



## □ 장애인 협회 및 경기 종목별 체육회와의 협의 미흡

### ○ BF인증 및 경기장 공인인증 관련 사전협의 미흡

- 장애인 편의시설 및 BF 본 인증을 위한 사전협회가 미흡하여 본 인증 추진 시 추가공사 발생
- 설계단계 시 경기 종목별 체육회와 협의 후 설계하였으나, 설계도서 상 확인이 불가 했던 사항과 선수들이 사용 후 보완사항 요구 등으로 공사추진에 어려움이 있었으며, 공인인증과 관련하여 협의에 미흡

## □ 심정 · 선학경기장 하자발생

### ○ 심정 실내테니스경기장 지붕층 누수

- 지붕 마감재 중 막부분 일부 하자(10cm 미만)와 지붕막 철골트러스 관통부 하자 즉시 보수
- 지붕 마감재 하부 방수판과 빗물받이, 창호 접합부 하자는 지붕 마감재 하부 접합부를 보수한 후 재 설치하여 보수 완료

### ○ 선학하키경기장 재설계로 전국체전 경기장 사용 무산

- 타 시도 하키경기장의 고무패드공법에서 들뜸 하자가 발생하였다는 통보와 함께 시공 방식을 고무패드에서 현장포설로 변경 요구
- 설계 변경한 후 재입찰하여 현재 공사 중

## II. 2014년 정책여건 및 목표

### 1 정책 여건 및 목표

#### 《 2014년 정책여건(SWOT) 분석 》

- **강점** : AG 경기장 등 각종 인프라 구축으로 성공적인 대회개최를 준비하고 시민의 문화·복지에 필요한 시설 확충으로 삶의 질 향상의 기반조성
- **약점** : 경기장 건설 비용 등 대회 개최관련 많은 소요 재원이 필요함에 따라 대회 이후 시 재정 운영에 부담으로 작용
- **기회** : 동북아의 관문도시로, 나아가 동북아 물류허브 도시로 발전할 절호의 기회이며 수천억에서 수조원의 생산·고용유발 효과, 부가가치가 창출
- **위협** : 2014 인천 아시안게임 관련 국비지원을 적게 받는다면 그 만큼의 시비나 지방채 발행에 따른 시 부채 증가

#### □ 정책목표

- AG 주경기장의 고품격 시공 및 공기 준수 등 완벽한 시설 건설
- AG 국비 추가확보를 위한 적극적인 노력으로 시 재정부담 완화
- AG 훈련시설, 민간·인접도시 기존경기장 개·보수 적기 완료
- 인천 비전 2014 프로그램 운영을 통한 인천의 국제적 위상 제고

### 아시아경기대회지원본부 역점과제

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| ① AG 주경기장의 완벽한 시설준공 및 준공식 준비 | ② AG 국비 추가확보를 위한 적극적인 활동 전개 |
| ③ 대회관련 시설 개·보수의 적기 완료        | ④ AG참가국 스포츠 및 문화교류 확대 증진    |

---

## Ⅲ. 2014년 주요업무계획

---

# 대회지원과

---

1. 2014 인천 AG 국비 추가확보 지속 추진
2. 소요재원의 안정적 확보 및 효율적 관리
3. 경기장 개·보수 및 지역 건설경기 활성화
4. 『인천 비전 2014 프로그램』 운영





## ① 주경기장 국비

### □ 쟁점사항

- 시의 30% 국비지원을 조정 요구에 기재부는 국회가 정한 24% 기준 고수

### □ 향후 추진계획

- 국회를 통한 정치적 해결 노력
  - 국회 교문위 및 예결특위 지속적인 방문을 통하여 예산안 심사과정에서 주경기장 국비지원율이 상향 조정되도록 적극 요청
- 정부를 상대로 지속적인 설득 및 적극적인 예산지원 요청
  - 타당성 재조사 용역중인 주경기장 총사업비 신청금액(5,216억원)의 전액 인정 요청
  - 총사업비 증액 요인 예산반영 및 내년도 예산의 조기 배정요청

《주경기장 국비요구 현황》

(단위:억원)

구 분	총사업비	국비(A)	기지원액(B)	'14년 지원요구액(A-B)	지원율
우리시(안)	5,216	1,565	765	800	30%
기재부(안)	4,900	1,176		411	24%

☞ 2014년 국비지원 추가요구액 : 389억원(800억원 - 411억원)

## ② 국비 비보조 사업

### □ 현황

사 업 명	사업비(백만원)	사 업 명	사업비(백만원)
미인정 보상비	1,449	주경기장 훼손지 복구비	388
방송보도시설(MMC)	32	송림(생활체육)	139

## □ 향후 추진계획

- 중앙정부를 상대로 방송 보도시설(MMC) 및 미인정 보상비 등 국비 비보조 사업에 대한 국비 지원(내년도 추경 반영)을 적극 요청

## ③ 인천 아시안게임 지원법안

### □ 현황

- 국회 교육문화체육관광위원회 법안심사소위원회 계류 중
  - 경기장 건설(30 → 75% 이상), 경기장 진입도로(50 → 70% 이상)
  - 지자체가 발행한 대회 시설관련 지방채를 국가가 인수하는 방식으로 지원

### □ 쟁점사항

- 부산 등 일부도시 및 기재부, 문체부는 특정 대회에만 국비를 많이 주면 형평성에 어긋나고 국비 지원 비율이 너무 높다는 지적을 제기하며 법안 통과에 부정적인 반응임

### □ 향후 추진계획

- 아시안게임 지원법률 개정(안)의 국회 통과를 적극 요청
  - 우리시가 총사업비 조정, 체육공원 조성 백지화, 선수촌·미디어촌, 구월보금 자리주택 활용 등으로 사업비 절감을 위한 많은 노력과 부동산 경기의 장기 침체로 재정형편이 어려운 상황 속에서 지방채를 발행하여 대회비용을 충당하여야 하는 개정의 필요성 등을 국회 위원들에게 적극 피력



- ◆ 경기장 건설 및 대회 인프라 구축을 위한 투자재원의 안정적 확보
- ◆ 저금리 자원의 조달 및 소요재원의 효율적 관리를 통한 비용 절감

## □ 추진개요

- 국비 지원확대를 위한 국회 및 중앙부처 협력 강화
- 국비 조기 확보 및 선 투입하여 지방채 발행시기 조정
- 저금리 정부기관 융자금 활용 등 차입선 다변화
- 고금리 지방채 대환 및 금리 재협의를 통한 이자 절감

## □ 재원확보 계획

- 연차별 사업비 확보계획

(단위:억원)

구 분	계	2010까지	2011년	2012년	2013년	2014년
계	17,451	6,238	1,500	2,321	5,035	2,357
국 비	4,873	888	1,000	1,321	915	749
시 비 (지방채발행)	12,554 (12,554)	5,350 (5,350)	500 (500)	1,000 (1,000)	4,120 (4,120)	1,584 (1,584)
기 타	24	-	-	-	-	24

※ 주경기장 국비 30% 지원 기준, 시비에는 국비 비 보조 사업비 포함

○ 지방채 발행계획

(단위:억원)

구 분	계	2010까지	2011년	2012년	2013년	2014년
발행액	12,554	5,350	500	1,000	3,380	2,324
정부자금	2,230	1,500	-	-	480	250
금융기관	10,324	3,850	500	1,000	2,900	2,074

□ 추진실적

- 상환이자 절감 : 년 14.5억원(15년간 217.5억원)
  - 고금리 지방채 차환 : 10억원(년리 4.53% ⇒ 3.20%로 1.33%↓)
  - 금리 재협의 : 4.5억원(년리 4.53% ⇒ 3.89 ~ 3.96%로 0.64%↓)
- 저금리 지역개발지원기금을 활용한 이자절감 : 년 4.3억원
  - 지방재정공제회 지역개발지원기금 차입 : 480억원(금리 3.2%)
  - 시중 금융기관 대비 0.9%이상 저리(절감액 연 4.3억원 예상)
- 신규 지방채 차입선 다변화(경쟁)를 통한 이자절감 유도: 이자율 3.54~3.96%
  - 하나대투증권, 농협 등 7개소 이상 경쟁 체제도입

□ 향후 추진계획

- 서구 주경기장 국비 추가확보
  - 사업계획 변경절차 이행 및 사업계획 재조사 용역 등을 통한 국비 추가확보 노력
- 대회지원법 법률(안)개정에 따른 평창지원 수준의 국비확보
- 소요재원의 효율적 관리
  - 상환이자 절감(고금리 지방채 ⇒ 저금리로 상환 및 금리 재협의)
  - 지방채 발행 시 차입선 다변화 ⇒ 이자발생 최소화
  - 지방채 발행 시기 조절 ⇒ 사업비 소요시기 적기 판단
  - 소요재원의 효율적 관리 ⇒ 국비 조기확보 및 선 투입

## □ 그간 추진현황

○ 계약현황 : 14개소(경기장 12개소, 도로2개소)

(기간:2009.1.1 ~ 2013.11.25/단위: 백만원)

구 분	총계	공사계약				용역계약			관급 자재 (지출)	미술 작품 (계약)
		건축 (토목)	정보통신	전기	기타	CM	실시 설계	기타		
계	696,920	442,382	29,039	46,685	4,078	29,293	34,325	12,154	95,271	3,693
서구주경기장	207,729	147,905	6,880	11,232	424	8,230	13,843	7,415	10,019	1,781
문학수영장	41,014	22,790	1,770	2,930	0	1,973	1,341	45	9,921	244
송림경기장	48,609	29,787	1,864	3,081	0	1,973	2,097	710	8,844	253
십정경기장	70,555	41,706	2,701	5,672	2,808	2,585	2,203	1,060	11,451	369
계양경기장	73,451	43,998	3,594	5,088	537	3,114	3,273	439	13,047	361
남동경기장	101,137	61,029	4,354	8,377	0	3,113	3,646	1,095	19,034	489
강화경기장	44,417	26,260	2,317	3,538	0	2,453	1,806	166	7,877	0
선학경기장	50,836	26,950	3,017	3,885	309	2,585	2,940	914	10,040	196
옥련실내사격장	19,777	12,047	1,738	1,512	0	933	925	221	2,401	0
계양사이클경기장	8,715	5,453	804	983	0	449	380	43	603	0
도원체육관 등	123	0	0	0	0	0	123	0	0	0
클레이사격장	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0
남동산단 교차로	25,088	21,163	0	334	0	1,885	0	33	1,673	0
선학경기장 진입로	5,404	3,294	0	53	0	0	1,683	13	361	0

## □ 향후 추진계획

① 민간경기장 및 기존훈련시설 개·보수 사업 : 6개사업 43건

○ 총사업비 : 175,924백만원

○ 세부내용

- 기존 경기장 개보수

· 계양사이클경기장, 도원체육관, 선학빙상경기장 : 17,758백만원

- 기타 실외경기장 건설
  - MTB(산악자전거), 비치발리볼, 트라이애슬론 : 18,344백만원
- 민간·인접도시 경기장 개보수
  - 인접도시 18개소(경기장15, 훈련시설3), 관내민간훈련시설(10) : 4,526백만원
- 선수훈련시설 개보수
  - 시소유(20개소), 국공립학교(18개소) : 7,736백만원
- 경기장 진입로 확충 및 교차로 개선
  - 남동산단고가차도, 선학경기장진입로, 매소홀로, 강화진입로 : 119,769백만원
- 클레이사격장 건설 : 7,791백만원

## ② 지역업체 참여 확대 추진

- 대상사업 : 도원체육관 건축공사 등 개·보수 공사
- 지역업체 수주기회 확대
  - 지역제한 공사 기준금액 미만으로 본공사 및 기타 공사 분리 가능 검토 후, 지역제한입찰 실시로 지역건설업체 수주기회 부여
  - 지역제한공사 : 일반 100억원 미만 , 전문 7억원 미만, 기타 5억원 미만
- 100억이상 입찰공고시 지역업체 참여율 명기
  - 공동도급률 49% 이상 , 하도급률 60% 이상
- 지역업체 생산자재 사용 독려
  - 관급자재 발주시 사업부서와 협의를 통한 구매 확대

## ③ 대가의 신속 지급 및 투명한 관리

- 선금 : 40%이상으로 지급 비율 확대 실시
- 기성금 : 기성대가 신속 지급으로 업체 자금난 해소 및 지역경제 활성화
- 하도급 대금 현금 및 직불 추진
  - 원도급 업체와 계약 시 이행 각서 징구
- 임금 체불 방지 대책 강구
  - 하도급 대금 및 임금 체불 신고센터 상시 운영
  - 대가 지급전 SMS 문자통보 (원도급 및 하도급 업체)



아시아 각국 올림픽위원회와의 스포츠 교류 및 지원을 통한 긴밀한 우호협력 네트워크 구축으로 아시아 스포츠 균형발전 및 2014 인천 아시아경기대회의 성공 개최에 기여

## □ 사업개요

- 기 간 : 2007 ~ 2014(8년)
- 사 업 비 : 2,000만 달러
- 주요사업
  - 인천시 : 전지훈련, 지도자 파견, 장비지원 등
  - O C A : 아시아 스포츠 발전을 위한 국제 스포츠 행사 지원 등

## □ 추진상황

- 아시아 스포츠 균형발전 지원 : 30개 국가, 147건, 653명
  - 전지훈련(69건, 631명), 지도자파견(20건, 22명), 장비지원 등(58건)
  - 국제대회 메달획득 : 8개 국가, 5개 종목, 88명(금29, 은21, 동38)
  - 런던올림픽 출전 : 4개 국가, 3개 종목, 5명
- 스포츠 교류를 통한 남북한 평화증진 도모
  - 북한 사업비 확보(790천\$), 단둥 축구화 구입·지원(요르단 등 11개국, 2,898켄레)
- OCA 및 NOC와의 우호협력 증진
  - 2014년 이후, 지속 운영 합의 : 제10차 운영위원회 (2012. 6. 16)
  - 인천시 주관사업비 상향 조정 : 2007~2010(27.1%), 2011~2013 (44.6%)
  - NOC 임원 및 주요인사 초청 : 14개국 28명
- 『비전 2014 프로그램』을 통한 인천 AG 홍보
  - 스포츠 장비 현지 전달 및 NOC와의 회담을 통한 AG 지지와 참여 유도
  - 홍보 브로셔(5,750부) 및 동영상(600개) 제작, NOC·재외공관 제공

## □ 2014년 운영계획 (성공 마무리 & 새로운 도약)

### ① 효율적 운영, 성과 표출 → 2014인천AG, 감동! + 축제!

- 2014년 인천시 주관 사업비 최대 확보
  - 2014년 국제부담금 1,429천\$ 중, 700천\$(49.0%)
  - \* 인천시 주관사업비 확보율 : 2007 ~ 2010 (27.1%), 2011 ~ 2013 (44.6%)
- 스포츠 약소국 선수의 메달 획득 프로젝트로 운영, 결실 도모
  - 비전 참여 대부분 국가 초청 + 실전훈련 참여 여건 조성, 경기력 최적화
  - 노메달 국가 + 메달 유망 선수, 집중훈련
  - 전지훈련 17개국, 장비지원 5개국, 지도자 파견 3개국
- 인천AG 기간중, 비전 프로그램 홍보 및 참여 선수 조명
  - 「비전 프로그램 = 휴먼드라마」, 아시아인의 이목 집중 → 인천시 위상 제고
- 남북한 우호협력 및 평화증진 기여
  - 북한 사업비 지속 확보로 스포츠 교류를 통한 남북화해 분위기 조성
  - \* 총890천\$ [ 2014년 100, 과년도 790(집행 170, 미집행 620) ]
  - 남북 공동추진 TFT와 통일부간 협의를 통한 단계별 추진 (전지훈련, 장비지원)
  - 단동축구화 구입 및 판로 지속 확보 (5개국)
- 인천AG 유산 기록물 제작
  - 비전 프로그램 백서, 다큐멘터리, 국가별 참여현황 책자, 전지훈련 동영상 등

### ② 2014년 이후의 운영기반 조성(유산 프로그램) → 인천 브랜드 가치 향상

- 제12차 운영위원회시(2013. 12월), 기본사항 합의(사업규모 등)
- 「비전 프로그램 지속 연장 운영계획」 수립 추진
  - \* 아시아 각국 NOC와 우호증진을 위한 다양한 정책 발굴 등
- < 추진근거 >
  - \* 2014년 종료 이후 지속 운영 합의 : 제10차 운영위원회(2012. 6. 16)
  - \* 지속 추진, 기금 확보(2013년 사업비 일부) : 제11차 운영위원회(2013. 3. 1)



# 시설계획과

---

1. 대회 관련시설 사업계획 변경승인 추진
2. 민간경기장 및 인접도시 대회시설 활용
3. 실외경기장 건설
4. 방송 보도시설(MMC)설치
5. 경기장진입로 확충 및 교차로 개선사업

## □ 대회개요

- 대회명칭 : 2014년 제17회 인천아시아경기대회
- 대회기간 : 2014. 9. 19 ~ 10. 4 (16일간)
- 대회주최 : 아시아올림픽평의회 (OCA)
- 참가규모 : OCA회원국 45개국, 선수 및 임원 등 20,000명 이상
- 경기종목 : 36개 종목 (437개 세부종목)
- 대회시설 : 101개소 (경기장 49개소, 훈련장 52개소)

구 분	사업계획 승인 및 변경 경과				
	최초 ( '09.6.23)	1차 변경 ( '11.5.31)	2차 변경 ㉠ ( '12.12.31)	3차 변경㉡ ( '14.1월 예정)	증 감 (㉡ - ㉠)
경기장(개소)	40	49	49	49	-
인 천 시	25	33	34	34	-
신 설	12	16	16	16	-
기 존	5	10	11	12	증 1 (송도상설공연장)
민간·민자	8	7	7	6	감 1 (드림파크사격장)
인접도시	15 (11개 도시)	16 (8개 도시)	15 (9개 도시)	15 (9개 도시)	-
훈련시설(개소)	56	54	51	52	증 1 [탁구(성리중)]
사업비 (억원)	25,805	19,446	17,451	17,451	증 0
국비 대상사업	11,652	11,864	10,543	10,543	증 0
국비 非대상사업	14,153	7,582	6,908	6,908	증 0

## □ 추진경위

- 대회관련시설 사업계획 승인 [문체부]
  - '09.06.23(최초), '11.05.31(1차 변경), '12.12.31(2차 변경)
- 2014 인천 AG 지원사업 타당성재조사 완료 [2009. 12. 29 기재부]
- 사업계획(3차) 변경 대비 자료 수집·분석 : '13.3 ~ 11월
  - 경기장 변경 요청 건 검토 : 7건 (조정, 역도, MTB, 사격, 근대5종, 육상, 역도)
  - 훈련시설 변경 요청 건 검토 : 13건 (수영, 양궁, 육상, 야구, 복싱, 크리켓, MTB, 축구, 핸드볼, 유도, 카바디, 근대5종, 탁구)
  - 경기장 및 훈련시설 후보지 현장 조사 및 사용협의 등

## □ 향후 추진계획

- 대회관련시설 사업계획(3차) 변경승인 신청 [2014. 1월중, 문체부]
  - 신설경기장 준공에 따른 사업구역 확정 반영 : 5개소(강화, 계양, 남동, 십정, 선학 등)
  - 체육공원에정지 사업계획구역에서 제척 : 감사원 감사지적사항(계양, 남동, 선학)
  - 경기장 및 훈련시설 위치변경 반영 : 15개소(경기장 4, 훈련시설 11)
  - 기타 설계변경 등 총사업비 변경분 반영
- 사업계획(3차) 변경 중앙부처 협의 및 위원회 상정 : 2014. 2월
- 사업계획(3차) 변경 승인 예정 : 2014. 3월
- 사업계획(4차) 변경 준비 및 승인 신청 : 2014. 6월 ~ 12월
  - 경기장 등 준공 이후 사업구역 미확정 및 3차 변경 시 누락분 반영 등

- ◆ 수도권 쓰레기매립지 드림파크 조성사업과 연계한 경기장 건설
- ◆ 2014 인천AG 개최에 따른 사업비 재원 부담해소와 화합된 경기 개최를 위하여 민간 및 인접도시 경기장·훈련시설 활용

### [드림파크 경기장 건설]

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2010. 2월 ~ 2014. 6월
- 위 치 : 인천광역시 서구 수도권매립지
- 시 행 자 : 수도권매립지 관리공사
- 사업내용 : 골프, 수영(수구), 승마, 근대5종

(단위 : 억원)

구 분	계	골 프	수영(수구)	승 마	근대5종
사업비	1,734	733	437	475	-
규 모	-	골프코스 (36홀)	수영장	승마장	기존 경기장활용

#### □ 추진실적

- 2009. 6월 : 사업계획 승인(문체부)
- 2010. 9월 : 골프장 공사 착공
- 2012. 9월 : 골프장 공사 준공
- 2012. 10월 : 수영, 승마장 공사 착공
- 2012. 11월 : 수영, 승마장 공정율 48%

#### □ 향후 추진계획

- 2014. 6월 : 수영, 승마장 준공

## [민간·인접도시 대회시설 개·보수]

### □ 사업개요

#### ○ 개·보수 대상 및 사업비

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	개소	사업비	대 상	비 고
합 계	26	6,905		
인접도시 시설	18 (9개 도시)	4,023 (국비 1,206) (시비 378) (지자체 2,439)	경기장(15) 훈련시설(3)	
관내 민간 훈련시설	8	2,882 (국비 865) (시비 2,017)	훈련시설(8)	

### □ 추진실적

- 2009. 6월 : 사업계획 승인(문체부)
- 2012. 12월 : 사업계획 변경(2차) 승인
- 2013. 1월 : 현장조사 및 설계용역 의뢰
- 2013. 5월 : 관내민간시설 실시설계 착수
- 2013. 11월 : 관내민간시설 실시설계 완료

### □ 향후 추진계획

- 인접도시 경기장 개·보수(2014 AG조직위원회 시행)
  - 2013.12월한 : 인접도시 시설 개·보수 사업비 교부(AG조직위)
- 관내 민간훈련시설 개·보수
  - 2013. 12월 ~ 2014. 7월 : 공사 시행

◆ 마라톤 경기 등을 위한 도로 노면정비, MTB(산악 자전거), 비치발리볼, 트라이애슬론 등 실외 경기장 설치

### □ 사업개요

- 기 간 : 2013. 3월 ~ 2014. 8월
- 위 치 : 인천광역시 관내
- 사 업 비 : 9,998백만원 (국비 2,999, 시비 6,999)
- 사업내용 : 도로노면보수, MTB, 비치발리볼, 트라이애슬론

구 분	계	도로경기종목 도로노면정비	MTB (Mountain Bike)	비치발리볼	트라이애슬론
사업 규모		총연장 72.96km (마라톤, 사이클, 트라이애슬론)	크로스 컨트리 L=6km, B=2m	6코트 (메인1코트, 연습5코트)	수영 1.5km, 사이클 40km, 달리기 10km
사업비 (백만원)	18,344 (국비 5,503) (시비12,841)	16,693 (국비 5,008) (시비 11,685)	743 (국비 223) (시비 520)	542 (국비 163) (시비 379)	366 (국비 109) (시비 257)
시행기관		종합건설본부	AG 지원본부		

### □ 추진실적

- 2012. 12월 : 사업계획변경(2차) 승인
- 2013. 5월 : 실외경기장 실시설계 착수
- 2013. 7월 : 노면정비 실시설계 착수 (종합건설본부)

### □ 향후 추진계획

- 2013. 12월 ~ 2014. 2월 : 실외경기장 및 노면정비 실시설계 완료
- 2013. 3월 ~ 2014. 8월 : 공사 착공 및 준공

- ◆ 방송, 취재 및 보도활동을 지원하고 최적의 미디어 시설을 구축하기 위하여 방송보도시설(MMC) 설치

## □ 사업개요

- MMC(방송보도시설) : IBC(국제방송센터) + MPC(보도시설)

구 분	M M C (Main Media Center)		
	계	I B C (International Broadcasting Center)	M P C (Main Press Center)
위 치	-	송도컨벤시아 1단계	송도게일사 건물 (사무소, 모델하우스)
면 적(m <sup>2</sup> )	20,800	9,600	11,200
사 업 비 (백만원)	3,254	-	3,254

## □ 추진실적

- 2012. 12월 : 사업계획변경(2차) 승인
- 2013. 1월 : 현장조사
- 2013. 5월 : 실시설계 착수
- 2013. 11월 : 실시설계 완료

## □ 향후 추진계획

- 2013. 12월 ~ 2014. 5월 : 공사 착공 및 준공

- ◆ 남동산단 입구 사거리 입체화 및 경기장 진입로를 확충하여 교통난 해소와 AG 경기장 접근성 향상 도모

## □ 사업개요

사업명	사업규모	사업비 (백만원)	사업기간	추진상황	
				착공	현공정율 (13125기준)
계		110,292			
남동산단 고가차도	6차로, L=800m	32,500	'12.09. ~ '14.09.	'12. 9.18.	59.5%
선학경기장 진입로	4차로, L=236m	7,020	'12.08. ~ '14.04.	'12. 8.29.	76.0%
매소홀로 (구 관교로)	6차로, L=1.3Km (구월보급자리구간 제외)	59,172	'12.05. ~ '14.09.	'12. 5.31.	65.8%
강화경기장 진입로	4차로, L=1.27km	11,600	'13.05. ~ '14.05.	'13. 5.10.	59.3%

※ 매소홀로 : 종합건설본부 시행, 구월보급자리구간(L=1Km, 300억원)은 도시공사 시행

※ 강화경기장 진입로 : 강화군 공사 시행

## □ 향후 추진계획

- 2014. 4월 : 선학경기장 진입로 공사 준공
- 2014. 5월 : 강화경기장 진입로 확·포장 공사 준공
- 2014. 9월 : 남동산단 고가차도 공사 준공
  - 2014. 7월 : 남동산단 고가차도 임시 개통
- 2014. 9월 : 매소홀로 공사 준공
  - 2014. 7월 : 매소홀로 임시 개통



# 주경기장조성과

---

1. 서구 주경기장 건설사업
2. 주경기장 미술작품 제작·설치
3. 선수촌 및 미디어촌 건설사업
4. AG 기존 경기장 개·보수 사업
5. AG 훈련시설 개·보수 사업

## 1 서구 주경기장 건설사업

◆ 국제 수준의 최첨단 고품격 경기장을 건설하여 2014 인천 AG 성공적 개최지원 및 도시균형 발전 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 서구 연희동 378번지 일원
- 규 모 : 부지 631,975m<sup>2</sup>, 연면적 113,620m<sup>2</sup>  
관람석 62,848석(고정석 30,304 가변석 32,544)
- 사업내용 : 개 · 폐회식, 육상 및 크리켓 경기
- 사 업 비 : 489,997백만원(크리켓 50억원 별도)
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 2014. 6월(2014. 4월 건축공사 준공예정)

### □ 추진실적

- 주경기장 건설공사 추진
  - 공 정 률 : 81.15% (\*2013. 11. 24 현재)
  - 공사추진 내용
    - 주경기장 5층 및 보조경기장 골조공사 완료
    - 철골 트러스 설치 및 지붕공사
    - 보조경기장 및 크리켓 경기장 그라운드 조성

### □ 향후 추진계획

- 2014. 2월 : 지붕공사 완료
- 2014. 3월 : 서측 막공사 완료
- 2014. 4월 : 크리켓경기장 본부석 등 임시시설 설치
- 2014. 4월 : 주경기장 건설공사 준공
- 2014. 12월 : 가변석 철거

□ 조 감 도



□ 현장전경 (2013. 10월말 현재)



건축 공사 전경



철골트러스 설치



서측 외부 PC루버 설치

- ◆ 2014 인천AG 경기장 이미지를 부각시키고 옥외 공간 조화와 예술성을 갖춘 경기장 건설로 경기장을 찾는 시민들이 만족할 수 있는 최적의 상징적 미술작품 설치

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2013. 9월 ~ 2014. 4월
- 소요예산 : 1,780,654천원
- 사업규모

(단위 : 천원)

경기장	미술작품		사업비	위치	비고
	종류	수량			
주경기장	계	5점	1,780,654		
	옥외 조형물	1점	1,100,654	잔디 마당	
	옥외 조형물	1점	330,000	푸른들 마당	
	실내 조형물	1점	150,000	1층 로비	
	회화	1점	100,000	3층 통로	2점 1조
	회화	1점	100,000	4층 통로	2점 1조

## □ 추진실적

- 2013. 7월 : 2014인천AG 주경기장 미술작품 제작설치 공모 공고
  - 공모단위 5개 (조형물 등 3, 회화 2)
- 2013. 9월 : 2014인천AG 주경기장 미술작품 심사위원회 개최
  - 조형물 3점 선정, 당선작 없는 회화 2개작품 재공모
- 2013. 9 ~ 10월 : 2014인천AG 주경기장 회화 작품 재공모 및 작품 심사
- 2013. 10월 : 미술작품 심의 의뢰

## □ 향후 추진계획

- 2013. 12월 : 인천광역시 미술작품 심의위원회
- 2013. 12월 ~ 2014. 4월 : 제작 착수 및 설치

# □ 미술작품 설치 위치




주 경기장 / 작품 1 / 작품제목: full moon 2014

**작품명** : Full moon 2014  
**작가** : 김승환(인천)  
**주제** : 인천에 둥근 보름달이 떠 어둠을 밝혀주고, 오작교를 통해 아시안의 만남을 상징  
**소재** : 스테인레스스틸  
**규격** : 높이 20m, 폭 40m  
**설치위치** : 잔디마당

인천아시아경기대회주경기장 작품 2 제목: 공존의 운율(共存의韻律, Coexistence of the rhythm)

**작품명** : 공존의 운율  
**작가** : 김창기(인천)  
**주제** : 주경기장 디자인 컨셉인 '승무'와 김연아, 손연재 선수의 부드럽고 아름다운 선형이 모티브  
**소재** : 스테인레스스틸/ 마천석  
**규격** : 가로 13.6m, 세로 7.1m, 높이 15m  
**설치위치** : 푸른들마당

# 실내 조형물 위치 [1층 VIP 로비]

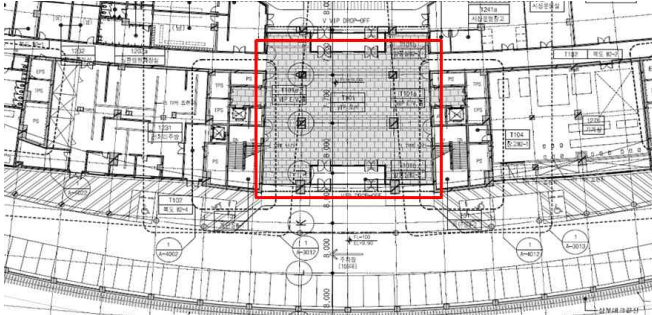

주경기장 작품3 제목: 판타지러너 (Fantasy Runner)





작품명	판타지 러너(Fantasy Runner)
작가	고경선(인천)
주제	육상선수의 꿈을 향한 출발 이미지 조형화 스타트라인에서의 극한 에너지 표출
자재	스테인레스스틸
규격	원반 12.6m, 높이 5.1m, 길이: 4.9m
설치위치	서측 1층 로비

주경기장 작품 A 제목: 빛 / 바람 - 1



빛은 전통공예 기법으로 800도의 고열에서 구워 색상이 영구적으로 변하지 않고 내구성이 강하며, 고급 질감을 손에 느끼는 공예 기법이다. 이 작품을 재료로 하여 주경기장의 모티브인 '빛'과 '바람'을 주제로 온 인류의 평화와 사랑의 열정을 예술적으로 형상화 하였다.

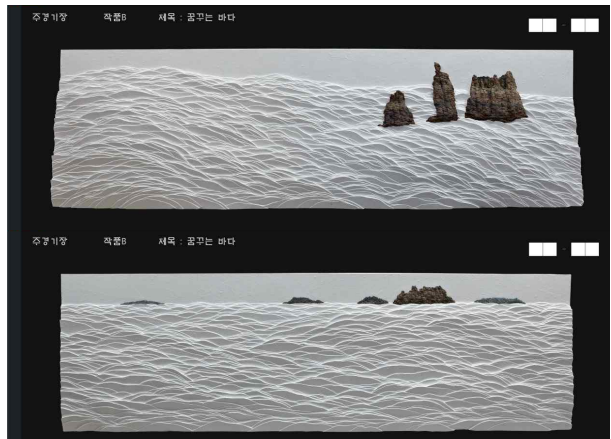

작품명	빛/바람	작품명	꿈꾸는 바다
작가	우영란(인천)	작가	이김천(경기도)
주제	주경기장의 모티브인 '빛'과 '바람'을 형상화	주제	서해바다와 백령도 두무진을 모티브로 생명의 탄생과 미래 희망 형상화
자재	등판에 칠보회화	자재	한지, 알루미늄판재, 스테인레스스틸
규격	(B)6.8m*(H)2.4m*2	규격	(B)6.0m*(H)1.8m*2
설치위치	서측 3층 통로	설치위치	서측 4층 통로



◆ 인천 도시공사에서 시행하는 구월보금자리 주택지구를 2014 인천아시아경기대회 선수촌·미디어촌으로 활용, 예산절감 및 쾌적하고 안락한 숙소를 제공하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2010. 5월 ~ 2014. 11월
- 위     치 : 남동구 구월동·수산동 일원(구월보금자리주택지구내)
- 면     적 : 840,713m<sup>2</sup> (254천평)
- 선수촌·미디어촌 사용 세대수 : 3,367세대
  - 선 수 촌 : 2,220세대
  - 미디어촌 : 1,147세대

### □ 추진실적

- 2010. 11월 : 구월보금자리주택 활용 계획 수립
- 2012. 3월 : 선수촌·미디어촌 사용협약 체결(시, 조직위, 공사)
- 2012. 3월 : 구월 아시아드 선수촌 건설사업 착공식
- 2013. 10월 : 골조공사 완료
- 2013. 12월 : 내부 마감공사 진행 중(방수, 조적, 창호)
  - ※ 공정률 67%(2013. 11. 30 기준)

### □ 향후 추진계획

- 2014. 6월 : 임시사용 승인
- 2014. 7월 : 선수촌·미디어촌 인수(도시공사→AG조직위)
- 2014. 9월 ~ 10월 : 선수촌·미디어촌 운영

## 4 AG 기존 경기장 개·보수 사업

◆ 2014 AG의 성공적 개최를 위해 기존 경기장을 국제공인 기준에 적합하게 개·보수하여 활용, 경제적·효율적인 대회기반 구축

### □ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	사업비	사업개요
계	17,812	
계양사이클경기장 개·보수 (종목 : 싸이클)	13,784	·트랙길이 : 333m ·공사내역 : 관람석1,508 부대시설3,297㎡
도원체육관 개·보수 (종목 : 유도, 레슬링)	3,273	·연면적 : 7,768㎡ ·공사내역 : 플로링 교체, 화장실사위장보수 등
선학빙상경기장 개·보수 (종목 : 핸드볼)	701	·설치면적 : 3,388㎡ ·공사내역 : 바닥판 설치·해체공사
송도 LNG야구장 (종목 : 소프트볼)	54	·설치면적 : 1,544㎡ ·공사내역 : 경기장 내·외벽도색, 내장공사

### □ 추진실적

#### ○ 계양 사이클경기장 개·보수사업

- 2013. 6월 : 공사 착공(2013. 12월 : 지상 2층 골조공사)

#### ○ 도원체육관, 송도 LNG야구장 개·보수사업

- 2012. 6월 : 설계용역 착수

- 2013. 11월 : 설계(안) 작성 완료, VE심사 및 일상감사 신청

#### ○ 선학빙상경기장 개·보수사업 : 종합건설본부 업무이관(2012.11)

### □ 향후 추진계획

○ 2014. 1월 : 도원체육관, 송도 LNG야구장 개·보수공사 발주

○ 2014. 6월 : 도원체육관, 송도 LNG야구장 개·보수공사 준공

○ 2014. 7월 : 계양 사이클경기장 준공



## 5 AG 훈련시설 개·보수 사업

◆ 2014 AG의 성공적 개최를 위하여 국공립학교 등 기존시설을 효율적으로 개·보수하여, 선수훈련시설로 활용하고 체육활성화 도모

### □ 사업개요

#### ○ 훈련시설 대상사업

구 분	총사업비	훈련시설 대상 사업			비고
		계	개·보수 (2권역, 연수구)	신설(크리켓 A,B)	
계	2,244(백만원)	11개소	9개소	2개소	

권역	경기종목	장 소	사업비(백만원)	비고
2권역 (연수구)	크리켓	송도LNG크리켓훈련장A	1,200	신 설
		송도LNG크리켓훈련장B		
	육상, 투척	송도 미관 광장	104	개 · 보수
	축 구	승기수질환경사업소	80	
		송도LNG축구장	400	
	야 구	송도LNG야구장B	50	
	럭 비	송도LNG인조구장	50	
	유 도	인천중	125	
	레슬링	인천대체육관	81	
	우 슈	해송고	10	
	트라이애슬론(수영)	송도LNG수영장	144	
	합 계		2,244	

### □ 추진실적

- 2013. 3월 : 개·보수대상시설 현장조사
- 2013. 6월 : 설계용역 착수
- 2013. 11월 : 설계용역 완료

### □ 향후 추진계획

- 2014. 1월 : 훈련시설 대상공사 발주(준공 : 2014. 6월)

# 경기장건설과

---

1. AG 훈련시설 개·보수 사업
2. 선학경기장 건설사업
3. 옥련 실내사격장 건설사업
4. 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 획득



## □ 사업개요

- 선수훈련 시설 개·보수 종합계획에 따라 노후된 선수 훈련시설 (3개 권역 24개소)에 대하여 개·보수 사업을 실시하여 2014 인천 아시아경기대회가 성공적으로 개최되도록 추진.

## □ 그간의 추진상황

- 2012. 7월 : AG 훈련장 및 경기장 학교체육시설 배치관련 사용 승인
- 2013. 1월 : AG 대회관련시설의 설치·이용 등에 관한 계획 승인·고시
- 2013. 3월 : AG 경기장 및 훈련시설 개·보수 종합계획(주경기장조성과)
- 2013.10월 : AG 개·보수대상 선수훈련시설 점검계획(경기장건설과)
- 2013.10월 : AG 개·보수대상 선수훈련시설 점검

## □ 훈련시설 개·보수 현황

- 사업기간 : 2013. 11월 ~ 2014. 6월
- 사 업 비 ; 3,955백만원
- 사업대상 : 훈련시설 3개 권역 24개소

## □ 향후 추진계획

- 2013. 11월 : 설계용역 발주(2014. 2월 설계용역 준공)
- 2014. 4월 : 개·보수공사 착공(2014. 6월 공사 준공)

## 【 훈련시설 개·보수 대상 】

(단위:백만원)

권역	구·군	훈 련 시 설	사업비	비 고
계		24개소	3,955	
1권역	중·동·남구	송현초(핸드볼)	62	건설관리팀
		송림초(농구)	166	
		제물포고(농구)	36	
		도원수영장(수영)	254	
		공항공사 체육관(공수도)	60	
		인천 비즈니스고(핸드볼)	128	
		인화여중(핸드볼)	78	
소 계		7	784	
3권역	남·남동구	연학초(농구)	166	건설기획팀
		인천고(복싱)	110	
		문학축구장 보조구장(육상/트랙)	99	
		문학하키장(하키)	550	
		문학복싱훈련장(복싱)	110	
		올림픽기념관(핸드볼)	57	
		청소년수련관(배구)	85	
		만수고(배구)	120	
		만성중(태권도)	78	
소 계		9	1,375	
4권역	부평·계양·서구	부평여고(하키)	531	건설지원팀
		서운고(체조)	125	
		경인교대(배드민턴)	30	
		계산국민체육센터(세팍타크로)	60	
		계산고(카바디)	120	
		인재개발원(역도)	51	
		인천체고(육상.트랙)	99	
		환경공단 청라사업소(축구)	780	
소 계		8	796	



## □ 사업개요

- 위 치 : 인천 연수구 선학동 83번지 일원
- 규 모 : 대지 441,659㎡, 연면적 13,154㎡
  - 선학하키경기장 : 지하1 ~ 지상 3층(8,115석)
  - 다목적 체육관 : 지하1 ~ 지상 3층(2,104석)
  - 종 목 : 복싱, 하키
- 공사기간 : 2011. 10월 ~ 2014. 1월
- 사 업 비 : 240,930백만원(국비 46,755 / 시비 194,175)
  - 사업비는 총사업비 조정 6차 승인금액(2013. 10. 29)

## □ 추진실적

- 2011. 10월 : 건설공사 착공
- 2012. 12월 : 골조공사 완료, 다목적체육관 PC 스탠드 완료
- 2013. 4월 : 지붕공사 완료
- 2013. 11월 : 내·외부 마감공사 진행(공정율 98%)

## □ 향후 추진계획

- 2013. 12월 : 내·외부 마감공사 완료(공정율 99%)
- 2014. 1월 : 공사 준공



## □ 사업개요

- 위 치 : 인천 연수구 옥련동 산 36번지 일원
- 규 모 : 대지 96,562㎡, 연면적 9,991㎡
  - 층 수 : 지상 4층
  - 관람석 : 1,337석
  - 종 목 : 사격 4종
- 공사기간 : 2012. 9월 ~ 2014. 6월
- 사 업 비 : 32,451백만원(국비 9,735 / 시비 22,716)
  - 사업비는 총사업비 조정 6차 승인금액(2013. 10. 29)

## □ 추진실적

- 2012. 9월 : 공사 착공
- 2013. 3월 : 관리동(총기격납고 및 실탄저장소) 설치 완료
- 2013. 11월 : 사격장동 내부 미장·조적공사 진행(공정율 63%)

## □ 향후 추진계획

- 2013. 12월 : 사격장 동 외장판넬 공사 진행(공정율 70%)
- 2014. 4월 : 마감공사 완료
- 2014. 6월 : 공사 준공



## □ 사업목적

- Barrier Free(장애물 없는 생활환경 인증제) 제도 도입을 추진하여 사회적 약자의 생활환경 조성에 기여하고, 일반시민들의 이동 편의성도 향상시켜 더욱 Up-Grade된 서계 일류 명품 경기장 건설을 위한 인프라를 구축하고자 함.

## □ 추진실적

연번	경기장	예비인증	본 인증	인 증 기 관
1	문학수영장	11. 4. 1	13. 9.13	(재)한국장애인개발원
2	송림경기장	11. 4. 1	심의 중	
3	십정경기장	11. 4. 6	추가공사 중	
4	강화경기장	11. 6. 2	심의 중	
5	계양·남동경기장	11. 6.30	심의 중	
6	선학경기장	11. 9.28	14. 2월예정	
7	옥련실내사격장	12. 3.20	14. 7월예정	

## □ 향후 추진계획

- 2014. 2월 : 십정·선학경기장 BF 본 인증 신청
- 2014. 7월 : 옥련실내사격장 BF 본 인증 신청
